

ՀՈՒՆԻՍ 2024

**ԱՄՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

1. Շահագործման տարածաշրջանի տնօրինություններ	3
1.1. Ջրամատակարարման համակարգի կառավարում	3
1.2. Ջրաչափերի փոխարինում և տեղադրում	7
1.3. Ջրահեռացման համակարգ	8
1.4. Կեղտաջրերի մաքրում և հեռացում	9
1.5. Էներգահամակարգ	9
2. Առևտրային տնօրինություն	10
2.1. Բաժանորդների տվյալներ	10
2.2. Հասույթ	11
2.3. Գանձում	12
2.4. Դեֆիտորական պարտքեր /Իրավաբանական վարչություն/	12
2.5. Ջրաչափեր	13
2.6. Ապօրինի միացումների հայտնաբերում և վերացում	14
3. Տեխնիկական տնօրինություն	15
3.1. Ջրամատակարարման շարունակականություն	15
3.2. Էլեկտրաէներգիայի կառավարում	16
3.3. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ	18
3.4. Ջրատար համակարգի բարելավում	18
3.5. Քլորի և խմելու ջրի մաքրման կայանների ծառայություն	19
3.6. 1-85 թեժ գիծ	21
4. Լրատվական ծառայություն	22
5. Որակի, առողջության և անվտանգության բաժին	24
5.1. Դասընթացներ/սեմինարներ	24
5.2. Ռիսկերի հայտնաբերում/մեղմացնող միջոցառումների կիրառում	26
5.3 Քլորի տարողությունների՝ կոնտեյնների և բալոնի գազագերծման (դեգազացիայի) փչամաքրման, տեխնիկական վկայագրման և ներկման աշխատանքներ	27
5.4. Վեոլիա Գրուպի Բարձր Ռիսկերի Կառավարման ստանդարտներ	28
5.5. համագործակցություն ՀՀ ՆԳ նախարարության և ՀՀ Մարզպետարանների հետ	28
5.6. Վեոլիա գրուպի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ միջև կնքված առողջության և անվտանգության պայմանագիր	28

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.1 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաշվետու ժամանակահատվածում Վեդլիա Հնկերության սպասարկման տարածքում իրականացվել են վթարա-
որոնողական և ջրագծերի և կոյուղագծերի վերակառուցման, ջրակորուստների հայտնաբերմանն ու վերացմանն
ուղղված աշխատանքներ, մասնավորապես.

Գյուղ Ջրածոր

■ Շիրակ տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ
դարձավ, որ Ղազանչի 2 D-600մմ թուջե ջրատարում նկատվել է ջրաքանակի զգալի կորուստ, ինչը հանգեցրել էր
ջրամատակարարման ցանցում ճնշման անկման: Ջրատարի տարբեր հատվածներում ուսումնասիրություններ
կատարելով, հայտնաբերվեց վթարված հատվածը՝ տնտեսելով $Q = 80$ լ/վ ջրաքանակ:



Գյուղ Մարմաշեն

■ Շիրակ տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ ուսումնասիրվեց Մարմաշեն գյուղը սնուցող
D=80մմ պողպատե ջրագիծը, որը անցնում է գյուղի վարելահողերի միջով և ուներ մի քանի վթարված հատվածներ:
Ներսրսկման միջոցով փոխարինվեց L=40մ հատված D=40մմ ՊԷ ջրագծով՝ խնայելով $Q=1,5$ լ/վ ջրաքանակ:



Գյուղ Հայրավանք

■ Գավառ տեղամասի աշխատակիցների հետ Հայրավանք համայնքի 1-ին փողոցում իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց թվով 2 գաղտնի վթար $D = 90$ մմ ՊԷ ջրագծի վրա: Արդյունքում տնտեսվեց $Q = 8$ լ/վ ջրաքանակ:




Քաղաք Հրազդան

■ Հրազդան քաղաքում վթարաորոնողական աշխատանքներ կատարելու ընթացքում «Հայ Ֆիդայիններ» փողոցին հարակից դաշտերում $D = 500$ մմ պողպատե ջրատարի վրա հայտնաբերվեց վթար և 1 ապօրինի միացում որից սնվում էին մոտակա անասնախանոցները: Արդյունքում տնտեսվեց $Q = 1$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Քաղսի գյուղի տարածքում, Սևան-Երևան ավտոմայրուղու տակ՝ «Միլենիում» գազալցակայանի հարևանությամբ հայտնաբերվեց վթար $D = 150$ մմ պողպատե ջրագծի վրա: Արդյունքում տնտեսվեց $Q = 3$ լ/վ ջրաքանակ:

■ Հացառատ-Լճաշեն ջրատարի վրա կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում «Նոյ լենդ» հանգստյան գոտու հարևանությամբ անցնող $D = 500$ մմ պողպատե ջրատարից հայտնաբերվեց անհայտ միացում՝ $Q = 2$ լ/վ ջրաքանակով:




Քաղաք Արարատ

■ Արարատ տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար՝ Խանջյան 56 հասցեի հարևանությամբ անցնող $D = 100$ մմ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 5$ լ/վ ջրաքանակ:




Քաղաք Երևան

■ Հյուսիս տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար Ավան, Աճառյան 44 շենքի նկուղում $D = 80$ մմ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 11$ լ/վ ջրաքանակ:




■ Կենտրոն տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար Խանջյան 5 հասցեի (Մանկավարժական համալսարան) դիմաց, դիտահորի մեջ, $D = 250$ մմ թուջե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 15$ լ/վ ջրաքանակ:

■ Կենտրոն տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար Նալբանդյան 46 հասցեի հարևանությամբ անցնող $D = 50$ մ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 8$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Շահումյան տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Զորավար Անդրանիկի 105 շենքի հարևանությամբ անցնող $D=250$ մ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 4$ լ/վ ջրաքանակ:

■ Արաբկիր տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Այգեձոր 60 տան հարևանությամբ անցնող $D = 100$ մ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 3,5$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Արաբկիր տեղամասի աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված վթարաորոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար Հայրիկ Մուրադյան 33 տան հարևանությամբ անցնող $D = 100$ մ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q = 3,5$ լ/վ ջրաքանակ:

Գեղարքունիքի մարզ

■ «Սևան» տեղամասի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են Կոտայքի մարզի Զրառատ համայնքի $d=500$ մ $L=82$ գծմ պողպատե խողովակի շահագործումից հանման, $d=50$ մ $L=82$ գծմ պեթ խողովակի մոնտաժման և $d=32$ մ $d=32$ մ կարգավորման փականի տեղադրման աշխատանքներ:



Արարատի մարզ

■ «Մասիս» ենթատեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ 27, 28, 29 փողոցներում վերակառուցվել են $d=20-90$ մ $L=1415$ գծմ ջրագծեր, տեղադրվել է թվով 38 ջրաչափական դիտահոր, տեղադրվել և վերատեղադրվել է թվով 14 $d=15$ մ նոր ջրաչափ, թվով 15 կցաշուրթային և բրոնզե փական, թվով 1 ե/բ դիտահոր իրենց ծածկերով 1200×1200 մ: Շահագործումից հանվել են $d=219-273$ մ $L=600$ գծմ վթարային վիճակում գտնվող թուջե ջրագծեր: Կատարված աշխատանքների արդյունքում Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ բնակավայրի թիվ 27, 28, 29 փողոցներում բարելավվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, ապահովվել է սպասարկվող բաժանորդների անխափան ջրամատակարարումը, տնտեսվել է մոտ 4լ/վ ջրաքանակ, կատարվել է ցանցի աշխատանքների ճիշտ կազմակերպում: Ինչպես նաև գ. Մարմարաշեն թիվ 14-րդ փողոցում վերակառուցվել են $d=20-75$ մ, $L=280$ գծմ ջրագծեր, տեղադրվել է թվով 13 ջրաչափական դիտահոր, տեղադրվել և վերատեղադրվել է թվով 37 $d=15$ մ նոր ջրաչափ, թվով 2 $d=80-100$ մ կցաշուրթային փական, թվով 56 $d=15$ մ հետադարձ փական, տեղադրվել է թվով 2 ե/բ դիտահոր իրենց ծածկերով 1200×1200 մ: Շահագործումից հանվել են $d=50$ մ $L=280$ գծմ վթարային վիճակում գտնվող մետաղական ջրագծեր: Կատարված աշխատանքների արդյունքում Արարատի մարզի գ. Մարմարաշեն թիվ 14-րդ փողոցում բարելավվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, ապահովվել է սպասարկվող բաժանորդների անխափան ջրամատակարարում, տնտեսվել է մոտ 1լ/վ ջրաքանակ, կատարվել է ցանցի աշխատանքների ճիշտ կազմակերպում:



Արագածոտնի մարզ

■ «Աշտարակ» տեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում Արագածոտնի մարզի Գիտավան 1 թաղամասում իրականացվել են ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքներ: Վերակառուցվել են $L=1100$ զմ պլե ջրագծեր, տեղադրվել է թվով 1 ճնշման կարգավորիչ փական, թվով 1 փականային հանգույց, գլխամասային ջրաչափ:

Կատարված աշխատանքների արդյունքում Արագածոտնի մարզի Գիտավան 1 թաղամասում բարելավվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, ապահովվել է սպասարկվող բաժանորդների անխափան ջրամատակարարումը, ջրի ծախսը 11 լ/վ-ից նվազել է 1,5լ/վ, ինչի արդյունքում վերացել է մոտ 9 լ/վ կուրուստ:



Արմավիրի մարզ

■ «Էջմիածին» ենթատեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքում Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Պտղունք բնակավայրն ամբողջությամբ և Մուսալեռ բնակավայրի մի հատվածն արդեն ունեն կանոնավոր և բարձր ճնշմամբ ջրամատակարարում: Երկու բնակավայրերի համար կառուցվել է $d=250$ մմ $L=3620$ զմ ջրագիծ, միացումներն արդեն իսկ տրված են, բնակավայրերի 750 բաժանորդ ջուրը ստանում է նոր խողովաշարերով, որը նույնիսկ ամենաբարձրադիր հատվածներում առանց պոմպի ապահովում է 1 մթն ճնշում, որը լիովին բավարար է շուրջօրյա կանոնավոր ջրամատակարարում ունենալու համար:



■ «Արմավիր» տեղամասի աշխատակիցների կողմից Ակնալիճ համայնքի Գառնիկյան թաղամասում փոխարինվել է $d=50$ մմ $L=285$ զմ պողպատյա խիստ վթարային վիճակում գտնվող ջրագիծը՝ $d=63$ մմ պլե խողովակով: Նոր ջրագծից միացվել է թվով 4 բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծեր՝ թվով 96 բնակարան, ինչպես նաև թվով 4 առանձնատների ջրաչափական դիտահորերը դուրս են բերվել սահմանազատման կետեր, պողպատյա մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե խողովակներով: Ջրագծի փոխարինման արդյունքում տնտեսվել է 1,5-2լ/վ ջուր, վերոնշյալ բազմաբնակարան շենքերում կարգավորվել է ջրի ճնշումը:



Ջրահեռացման համակարգ

■ «Կենտրոն» տեղամասի աշխատակիցների կողմից Նորք 11փ 63 հասցեում կառուցվել է $d=200$ մմ $L= 36$ զմ/մ երկարությամբ կոյուղագիծ երկշերտ ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակներով:



Հունիս ամսվա ընթացքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում կատարված աշխատանքները հակիրճ նկարագրվում են Աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

Կատարված աշխատանքները	Չափման միավոր	Քանակ
Չափում հոսքաչափով	տեղ	1275
Որոնում խողովակափնտրիչ սարքով	մ	25958
Հոսակորուստի որոնում ակվաֆոնով	մ	26085
Հոսակորուստի որոնում կորեյատորով	մ	1700
Ջրաչափական հանգույններ ուսումնասիրություն, սխեմաների կազմում	հատ	0
Շահագործումից հանված ջրագիծ	մ	4703.5
Կառուցված ջրագիծ	մ	11933.5
Կառուցված կոյուղագիծ	մ	843
Վերացված գաղտնի վթարներ	հատ	10
Փոխարինված փական	հատ	641
Տեղափոխված/փոխարինված ջրաչափական հանգույց	հատ	470
Մաքրված դիտահոր	հատ	2108
Գաղտնի վթարների վերացման արդյունքում տնտեսված ջրաքանակ	լ/վ	6
Վերացված վթարներ	Չափման միավոր	Քանակ
Ջրամատակարարման ցանցում	հատ	1180
Ջրահեռացման ցանցում	հատ	1353
Պոմպակայաններում	հատ	0
Մաքրված անձրևընդունիչ	հատ	0

Հունիս ամսվա ընթացքում վերացված վթարների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև բերված Աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Վերացված վթարների քանակային նկարագիր

	Պոլիէթիլենային խողովակներ (հատ)	Մետաղական խողովակներ (հատ)	Ցանցում շահագործման և պահպանման աշխատանքներ
Ընդամենը	1063	821	1809

1.2. ԶՐԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ստորև Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է հունիս ամսվա ընթացքում տեղադրված, փոխարինված կամ սահմանազատման կետեր տեղափոխված տարբեր տրամաչափերի ջրաչափերի քանակը:

Աղյուսակ 3. Տեղադրված, փոխարինված, տեղափոխված ջրաչափեր

Կատարված աշխատանքներ	Ջրաչափի տրամագիծ, մմ										Ընդամենը
	15	20	25	30	32	40	50	65	80	100	
Տեղադրված	204	1	1	0	1	1	0	0	0	0	208
Փոխարինված	506	7	5	0	3	3	5	1	0	0	530
Տեղափոխված											0
Տեխ. ակտ	215	5	0	0	3	1	1	2	0	0	227
Ընդամենը	925	13	6	0	7	5	6	3	0	0	965

Ընդհանուր առմամբ տեղադրվել, փոխարինվել կամ սահմանազատման կետեր են տեղափոխվել 15-100 մմ տրամաչափի 965 ջրաչափ: Կատարված աշխատանքների 96%-ը վերաբերել է 15 մմ ջրաչափերին:

1.3. ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հունիս ամսվա ընթացքում ջրահեռացման ցանցում կատարված աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

h/h	Տեղամասի անվանումը	Կոյուղագծերի լվացում	Կոյուղագծերում առաջացած խցանումների բացում	Կոյուղագծերի կառուցում կամ վերակառուցում
		մ	տեղ	գծ/մ
1	Արաբկիր	2120	283	12
2	Քանաքեռ-Զեյթուն	0	227	0
3	Մաշտոց	440	219	180
4	Շահումյան	0	176	3
5	Շիրակ	1900	459	21
6	Արթիկ	110	88	0
7	Ապարան	0	46	12
8	Ալավերդի	2430	27	36
9	Աշոցք	0	8	0
10	Բերդ	1880	20	0
11	Իջևան	0	48	0
12	Լոռի	0	225	6
13	Նոյեմբերյան	55	16	30
14	Սպիտակ	0	12	0
15	Ստեփանավան	2435	29	0
16	Թալին	0	16	15
17	Տաշիր	0	14	0
18	Չարենցավան	0	105	0
19	Աբովյան	0	99	18
20	Հրազդան	0	77	42
21	Կենտրոն	150	214	36
22	Հյուսիս	110	258	61
23	Հարավ	0	294	6
24	Էրեբունի	0	119	12
25	Արմավիր	0	119	2
26	Արտաշատ	0	121	0
27	Էջմիածին	0	154	0
28	Աշտարակ	2160	44	49
29	Արարատ	0	67	0
30	Մասիս	0	44	0
31	Գավառ	380	30	3
32	Սևան	1440	67	0
33	Մարտունի	0	40	48
34	Վարդենիս	410	15	167
35	Ճամբարակ	55	26	0
36	Դիլիջան	0	73	82
37	Վայք	635	14	0
38	Եղեգնաձոր	0	24	0
39	Ջերմուկ	130	43	0
40	Սիսիան	0	19	6
41	Գորիս	0	46	12
42	Կապան	1076	85	80
43	Մեղրի	660	51	10
	Ընդամենը	18576	4161	949

1.4. ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՀԵՌԱՑՈՒՄ

Ընթացիկ ամսում «Կեղտաջրերի մաքրման կայանների» ծառայության ենթակայության տակ գտնվող կեղտաջրերի մաքրման կայաններում և պոմպակայաններում կատարվել են բազմաթիվ վթարա-վերականգնողական աշխատանքներ, որոնցից առանձնացվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Ջերմուկի կեղտաջրերի մաքրման կայանում հայտնաբերվեց օդամուղի խափանում: Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ պատճառը շարժիչի այրումն էր: Շարժիչը վերանորոգման նպատակով տեղափոխվեց արտադրամաս: Վերանորոգումից հետո օդամուղը տեղադրվեց իր տեղը և այժմ աշխատում է բնականոն ընթացքով:

■ Վարդենիսի կեղտաջրերի մաքրման կայանի մանր ճաղավանդակի քերիչ սանրերն ամբողջությամբ փաթաթվել էին աղբով, ինչը խոչընդոտում էր ճաղավանդակի բնականոն մաքրմանը: Արդյունքում քերիչ սանրերը ապամոնտաժվեցին և մաքրվեցին: Այժմ սարքավորումներն աշխատում են անխափան:

■ Դիլիջանի կեղտաջրերի մաքրման կայանում ջրհեղեղի պատճառով ամբողջ կայանը հեղեղվեց, որի արդյունքում հեղեղաջրերի հզոր հոսքը իր հետ բերեց հսկայական քանակությամբ տիղմ և խճաքարեր, որոնք պատեցին կայանի ամբողջ տարածքը, ներառյալ սարքավորումները և շենքը: Ինտենսիվ մաքրման և վերականգնման աշխատանքների շնորհիվ, հաջողվեց կայանը վերադարձնել սարքին վիճակի՝ մաքրելով բոլոր սարքավորումները և շենքը:

■ Վարդենիսի կեղտաջրերի պոմպակայանում շարքից դուրս էր եկել ֆազային պաշտպանիչ ռելեն, որի պատճառով պոմպակայանը դադարել էր աշխատել: Վերջինս փոխարինվեց նորով և այժմ պոմպակայանն աշխատում է բնականոն ընթացքով: Մաքրվեցին նաև հակադարձ փականները, որի աղտոտվածության պատճառով նվազել էր պոմպերի արտադրողականությունը:

■ Բոլոր ԿՄԿ-ներում և ԿՊ-ներում իրականացվել են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, ստուգվել են բոլոր սարքերը (թե էլեկտրական, թե մեխանիկական), կատարվել են կարգավորումներ:



Աղյուսակ 5. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

h/h	Գտնվելու վայրը	Կառույցի անվանումը	Մղված կեղտաջրերի ծավալը մ³	Մաքրված կեղտաջրերի ծավալը մ³	Կեղտաջրից առանձնացած կեղտ տ
1	ք. Գավառ	«Գավառ» ԿՄԿ	0	57,323	10.8
2	ք. Մարտունի	«Մարտունի» ԿՄԿ	0	76802	28.8
3	ք. Վարդենիս	«Վարդենիս» ԿՄԿ	0	155,127	5.4
4	ք. Ջերմուկ	«Ջերմուկ» ԿՄԿ	0	6,589	5.4
5	ք. Դիլիջան	«Դիլիջան» ԿՄԿ	0	0	0
6	ք. Սևան	«Սևանի» N3 պ/կ	20,657	0	0
7	ք. Սևան	«Սևանի» N5 պ/կ	11,564	0	0
8	ք. Գավառ	«Գավառ» պ/կ	9,900	0	0
9	ք. Վարդենիս	«Վարդենիս» պ/կ	7,400	0	0
10	ք. Ջերմուկ	«Ջերմուկ» պ/կ	1,684	0	0

1.5. ԷՆԵՐԳԱՀԱՄԱԿԱՐԳ

Թվով 422 բակային պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում թվով 412 հասցեում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Շարունակվում է բաժանորդների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 01.07.2024 թվականի դրությամբ «Ինտերակտիվ» համակարգ է մուտքագրվել 623,546 պայմանագիր. Հաշվառված բաժանորդների քանակական տվյալները հաշվետու ամսվա դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում.

Տնօրինություն	Սպառողներ	2024թ. հունիս ամսին ծառայություններ ստացած բաժանորդների թիվ	Կնքված պայմանագրերի քանակը	%
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	679,108	593,411	87,4
	Իրավաբանական անձ	33,240	30,105	90,6

Հաշվառված բաժանորդների քանակական տվյալները հաշվետու ամսվա դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում.

Տնօրինություն	Սպառողներ	Բաժանորդների ընդհանուր քանակ	Ծախսող բաժանորդների քանակ	%
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	751,538	605,439	80,6
	Իրավաբանական անձ	38,760	28,046	72,4

Սպառում չունեցող (0-ական ծախսեր) բաժանորդների մասով, հնարավորության դեպքում, լրացուցիչ ստուգայցեր են իրականացվում ինչպես տեղամասերի մասնագետ-տեսուչների, այնպես էլ կենտրոնական գրասենյակի համապատասխան աշխատակիցների կողմից: Միաժամանակ համեմատական վերլուծություններ են կատարվում այլ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների տվյալների հետ:

Առևտրային տեղամասերի սպասարկման տարածքում հաշվետու ամսում համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա ձևակերպվել և տվյալների բազա է մուտքագրվել թվով 889 նոր բաժանորդ:

2.2. ՀԱՍՈՒՅԹ

Շարունակվում է ջրաչափերի փոխարինման գործընթացը: Պիլոտային ծրագրերին (Շիրակ, Լոռի, Սևան և այլն) զուգահեռ փոխարինվում են նաև այլ տարածքներում անսարք ջրաչափերը: Նախկին ցածրորակ ջրաչափերը փոխարինվում են նոր՝ բարձրակազ և ավելի զգայուն ջրաչափերով: Խոշոր սպառում ունեցող իրավաբանական բաժանորդների ջրաչափերը, հնարավորության դեպքում, միացվում են Լոկատոր համակարգին՝ ծախսերը պարբերաբար, առանց այցելության, առցանց հսկելու նպատակով:

Իրավաբանական անձերի ջրաչափերը փոխարինվում և տեղափոխվում են բաժանորդների տարածքներից դուրս գտնվող հատուկ դիտահորեր, որը նվազեցնում կամ գրեթե բացառում է ապօրինությունների հնարավորությունը: Գրեթե ամբողջովին փոխարինվել և բաժանորդների տարածքներից դուրս են տեղափոխվել գործող բուժ. հաստատությունների, զին. մասերի, դպրոցների և մանկապարտեզների ջրաչափերը:

Փոխարինված ջրաչափերն ուղարկվում են պարտադիր լաբորատոր ստուգաչափման: Հունիսս ամսվա ընթացքում ստուգաչափվել է 5471 ջրաչափ:

Տնօրինություն	Սպառողներ	Սարքին	Անսարք	Միջամտած	Ստուգաչափված ջրաչափերի քանակ առ 06.2024
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	2948	1918	490	5356
	Իրավաբանական անձ	70	42	3	115
	Ընդամենը	3018	1960	493	5471


Փոխարինված ջրաչափերի լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա ջրաչափերի որոշ մասն ունի խնդիրներ: Օրինակ՝ հունիս ամսին փոխարինված 5471 ջրաչափերի մոտ 45 %-ը (կամ 2453 ջրաչափ) անսարք է կամ առկա է արտաքին միջամտություն:

Միջամտած ջրաչափերի մասով կազմվում են համապատասխան արձանագրություններ:


Ընթացիկ ամսում լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքում, անսարք և միջամտած ջրաչափերից կազմված արձանագրությունների հիման վրա վերահաշվարկվել է 219,859 մ³ հասույթ:

Ստորև՝ գրաֆիկական տեսքով, բերված են 2024թ. բաժանորդների ամսական սպառման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ.

Ստուգաչափված ջրաչափ

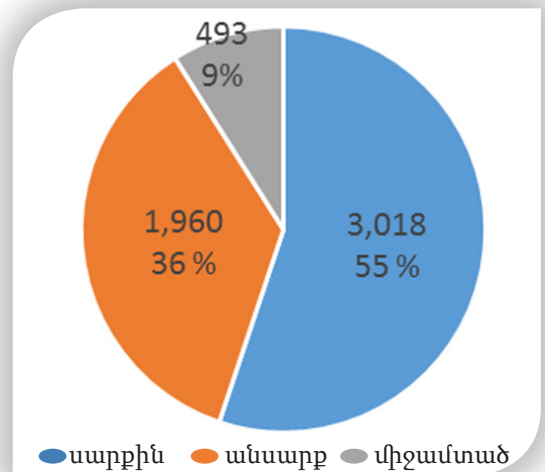

Հասույթ

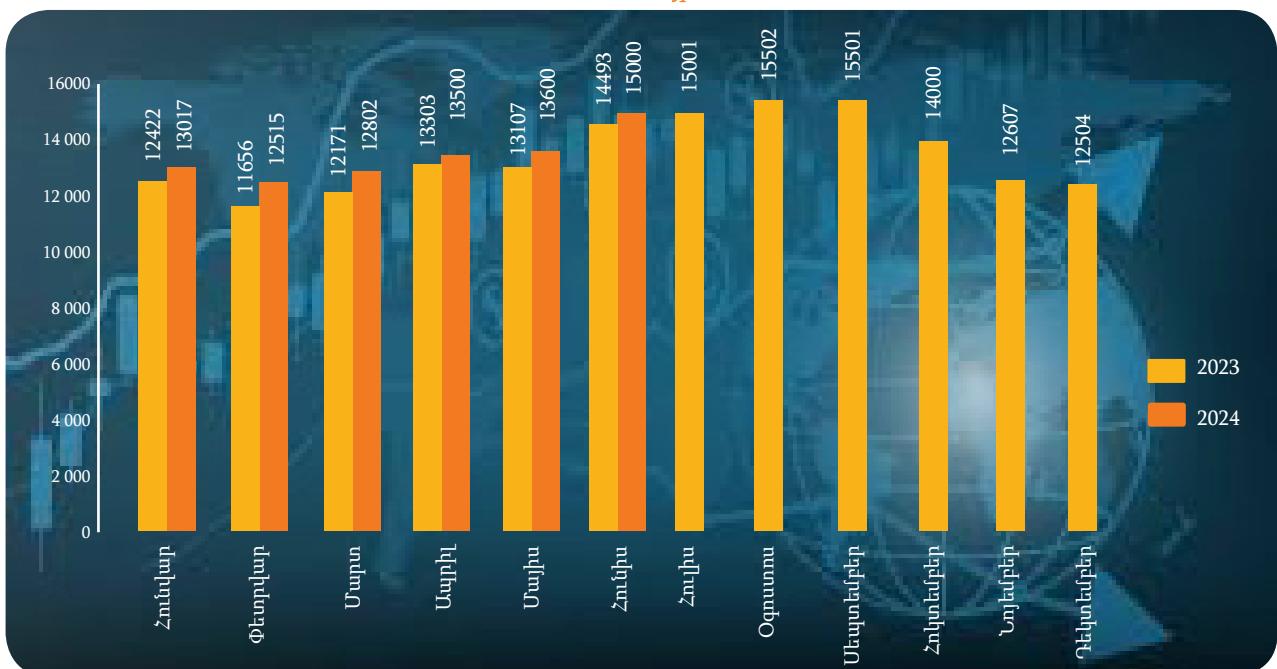

2.3 ԳԱՆՁՈՒՄ

Հունսի ամսին, նախորդ ամսվա ձևավորված հասույթի համեմատ, գանձումը կազմել է 2,537 մլն. դրամ (98 %): Նախորդ ամսվա ձևավորված հասույթի դիմաց վճարումները սահմանված ժամկետում ապահովելու նպատակով ընկերությունում կիրառվում են բաժանորդներին ուղարկվող հիշեցումների և ծանուցումների մի շարք մեթոդներ՝ էլեկտրոնային հաղորդագրություն, գրավոր՝ փոստային առաքում, ծանուցումներ, հեռախոսազանգեր և այլն: Պարբերաբար չվճարող բաժանորդներին «վճարման դաշտ» բերելու նպատակով՝ հնարավորության դեպքում իրականացվում են պայմանագրով և գործող կարգով նախատեսված անհատական ջրամատակարարման դադարեցումներ՝ մինչև պարտքի մարումը կամ պարտքի մարման ժամանակացույցի կնքումը, սակայն, հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում, հաշվետու ամսվա ընթացքում մեր կողմից չեն իրականացվել նաև պայմանագրով և գործող կարգով նախատեսված անհատական ջրամատակարարման դադարեցումներ: Այս իրավիճակը, բնականաբար, իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել գանձման բարձր, նախատեսված ցուցանիշների ապահովման գործում:

2.4 ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ / ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ/

Համեմատաբար մեծ դեբիտորական պարտքերի գանձման նպատակով Առևտրային տնօրինության աշխատակիցների կողմից շարունակվում է պարտքերի մարման ժամանակացույցերի կնքման գործընթացը: Հունիս ամսվա ընթացքում Առևտրային տնօրինության կողմից կնքվել է թվով 206 պարտքի մարման ժամանակացույց՝ մոտ 24.5 մլն դրամ ընդհանուր գումարով: Ժամկետանց խոշոր դեբիտորական պարտք ունեցող բաժանորդների պարտքերի գանձմանն իրավական ընթացք տալու համար, առաջնահերթ նոր պայմանագրեր են կնքվում այդ բաժանորդների հետ, ճշգրտվում են դեբիտորական պարտքերի չափը, և պարտատերերի ցուցակները ներկայացվում են իրավաբանական վարչություն:

Ստորև աղյուսակով ներկայացվում են դեբիտորական պարտքերի և հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ արձանագրություններով դատարան ներկայացված գործերը:

Դատարան ներկայացված գործերի քանակը շարունակական		Բավարարված		Մերժված		2017-2024թթ. ընթացիկ որոճեր		ԴԱՀԿ ներկայացված գործեր	
քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար
32,576	4,436,761,064	20,140	2,324,336,257	1,065	257,653,022	12,436	2,112,424,807	12,252	1,458,186,184

Ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակը՝ դատարան ներկայացրած գործերի ընդհանուր քանակի 62 %-ն արդեն բավարարված է և ընդամենը 3 %-ը մերժված:


Դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ տվյալները բերված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

Տնօրինություն	Պարտքը 01.07.2024թ. դրությամբ (մլն. ՀՀ դրամ)	Այդ թվում հուլիս ամսվա հասույթ (մլն. ՀՀ դրամ)
Առևտրային, այդ թվում	11,826	2,847
Բնակիչ-բաժանորդներ	8,285	1,927
Իրավաբանական անձեր	3,541	920

Հարկ է նշել, որ մարզերի տարածաշրջանի բաժանորդների առկա պարտքերը դեռ հստակեցված չեն և առայժմ հանված չեն այլ ընկերություններ փոխանցված վճարումները, ինչպես նաև հաշվի չեն առնված բաժանորդների՝ նախկինում ունեցած կանխավճարները: Նշված հանգամանքը բավականին դժվարեցնում է բաժանորդների հետ դեբիտորական պարտքերի ճշգրտման ու գումարների հավաքագրման գործընթացը, ինչպես նաև դատական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը:

Շուրջ 423.8 մլն. ՀՀ դրամը կուտակվել է երկու բաժանորդներին մատուցված ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց մեծածախ սակագնով պարբերաբար չվճարելու պատճառով: Դրանք են՝ «Հաճն Ջուր» ՀՈԱԿ-ը և «ՀՀ Արարատի մարզի Ագատաշեն» համայնքը:

2024 թ. դեբիտորական պարտքերի շարժը / մլն. դրամ (Մարզեր)

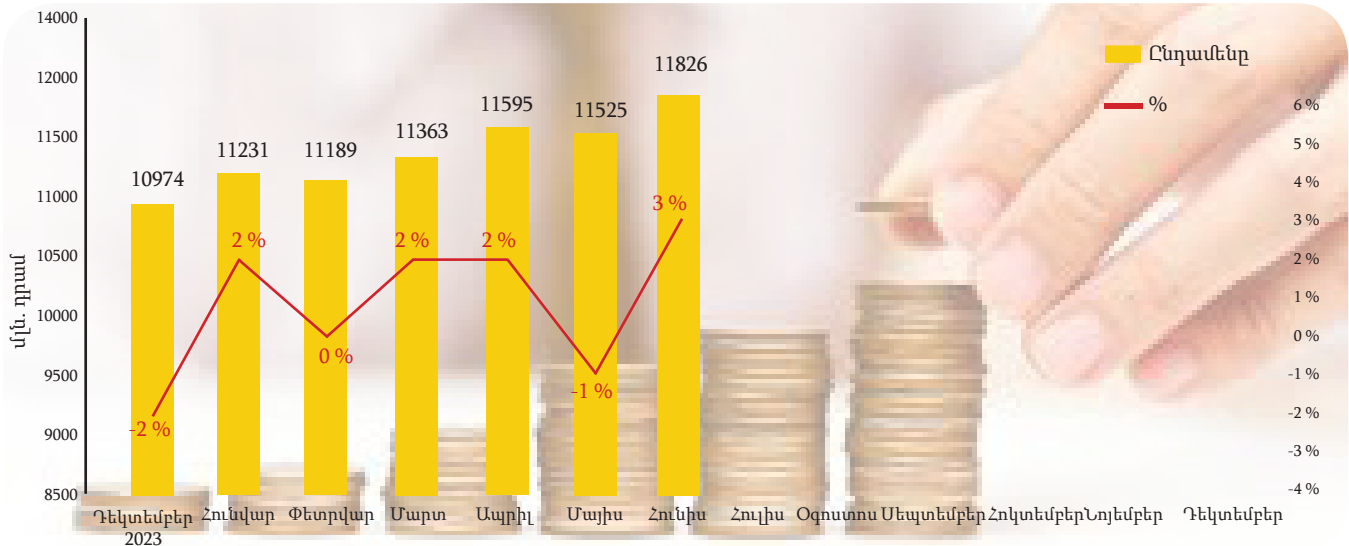

2.5 ԶՐԱԶԱՓԵՐ

Բաժանորդների տվյալների բազայում 01.07.2024թ. դրությամբ հաշվառված ջրաչափով և առանց ջրաչափի (նորմատիվային եղանակով հաշվարկվող) բաժանորդների քանակական տվյալները բերված են ստորև աղյուսակում.

Տնօրինություն	Սպառողներ	Բնակիչ-բաժանորդներ			Իրավաբանական		
		Ընդամենը	Այդ թվում՝ ծախսող	%	Ընդամենը	Այդ թվում՝ ծախսող	%
Առևտրային	Ջրաչափով	722,860	604,497	82.63	37,754	28,037	74.26
	Առանց ջրաչափի	28,678	942	3.28	1,006	9	0.89

Տվյալների բազայում 01.07.2024թ. դրությամբ պիտանելիության ժամկետը (12 տարին) գերազանցող ջրաչափերի քանակական տվյալները ներկայացված են աղյուսակային տեսքով.

Տնօրինություն	Բնակիչ-բաժանորդներ			Իրավաբանական		
	Գործող ջրաչափերի քանակը	Այդ թվում՝ ժամկետանց	%	Գործող ջրաչափերի քանակը	Այդ թվում՝ ժամկետանց	%
Առևտրային	894,042	378,211	42.30	41,009	6,565	16.01

Առաջնահերթությամբ՝ խափանված, հետո պիտանելիության ժամկետը գերազանցող ջրաչափերի տվյալները ներկայացվում են համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ դրանց փոխարինման նպատակով:

Հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղադրվել և փոխարինվել է (այդ թվում՝ թաղամասային ծրագրով) 6462 ջրաչափական սարք: Այդ թվում՝ նախկինում ջրաչափական սարք չունեցող բաժանորդների մոտ տեղադրվել է 711 նոր ջրաչափ և այդ բաժանորդներին մատուցված ծառայությունների հաշվարկն այսուհետ կատարվում է նոր տեղադրված ջրաչափերի ցուցմունքների հիման վրա:

Երևանի թաղամասային ծրագրի շրջանակներում կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են գոյություն ունեցող ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ ավելի բարձր դասի ջրաչափերով, ինչն էլ նպաստում է բաժանորդների միջին ծախսի ճշգրիտ հաշվառմանը:

ՊԿԱՄ տեղադրված ջրաչափեր

Հասցե	Ջրաչափերի ընդհանուր քանակ	Տեղադրված ջրաչափերի քանակ	%
գ.Քասախ	2489	2049	81.9
գ.Պոռշյան	1724	1134	66.5
ք.Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ.	6035	1975	32.4

Տեղամասերում ընկերության տնօրինությունների ուժերով իրականացվում է բաժանորդների ջրաչափերի փոխարինման թաղամասային ծրագիրը:

Ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել մի շարք տեղամասերի սպասարկման տարածքներում: Առկա անսարք և փոխարինման ենթակա ջրաչափերից արդեն փոխարինվել է Լոռի տեղամասի սպասարկման տարածքի տարբեր հասցեներում՝ 20669, Շիրակ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 18515, Գորիս տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5035, Կապան տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5834, Սիսիան տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 2909, Արարատ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5243 և Արտաշատ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 8512 ջրաչափական սարք:

2.6 ԱՊՕՐԻՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՑՈՒՄ

Առևտրային տնօրինության տեղամասերի աշխատակիցների ամենօրյա աշխատանքի մաս են կազմում ապօրինի միացումների հայտնաբերման, արձանագրման և ապօրինությունների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները: Կազմված արձանագրություններն «Ինտերակտիվ» համակարգ մուտքագրելուց հետո, ապօրինություն կատարած անձիք սահմանված կարգով ծանուցվում են, նրանց են ներկայացվում վերահաշվարկվող, վճարման ենթակա գումարների չափերը, իսկ տվյալ հասցեները փոխանցվում են տարածաշրջանի շահագործման տնօրինությանը՝ ջրագրվում իրականացնելու նպատակով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերված ապօրինի միացումների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների հիման վրա վերահաշվարկված ջրածախսերի տեղեկատվությունը բերված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Տնօրինություն	Քանակ	Խ.մ.	Գումար (ՀՀ դրամ)
Առևտրային	371	214,860	39,527,876

Ապօրինությունների հայտնաբերման և արձանագրությունների կազմման գործառույթը, տեղամասերի առևտրային ծառայության աշխատակիցներից բացի, իրականացվում է նաև Գլխավոր տնօրինության առևտրային վերահսկողության աշխատակիցների կողմից:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորև ներկայացված գրաֆիկում պատկերված են Երևան քաղաքի հունիս ամսվա շարունակականության տվյալները, որը կազմում է 94.5%, ինչը 2.1%-ով ցածր է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշների համեմատ:


Շարունակում է գործել ընկերության կողմից սպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման գրաֆիկը, որը համաձայնեցվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ:

Զրամատակարարման շարունակականություն Երևան

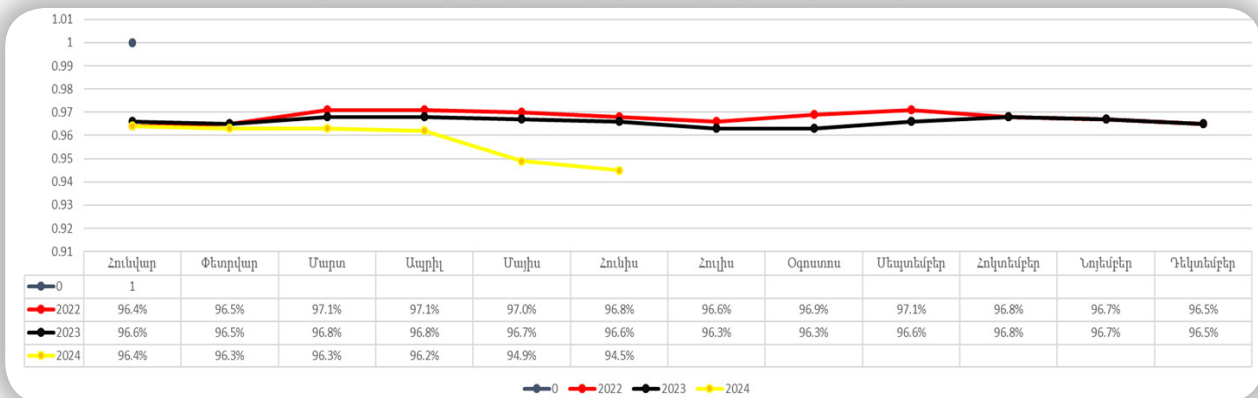


Հաշվետու ամսվա ընթացքում «Շարունակականության և մոնիթորինգի բաժնի» կողմից ՇՏ-ներում կարգաբերվել է թվով 80 ՃԿՓ:

Ստորև ներկայացված է կարգաբերված ՃԿՓ-ների գրաֆիկներից մի քանիսը.




Երևան քաղաքը սնող Գառնի, Ապարան, Արզնի 1, Արզական, Գյումուշ 1,2 և Կաթնաղբյուրի ջրատարների ինքնահոս ջրաքանակը 2024թ-ի հունիս ամսին 2023թ-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 123լվ-ով, իսկ Երևան քաղաքի ջրարտադրության համար էլ. էներգիայի ծախսն ավելացել է 448 հազար կՎտ-ով, ինչը երևում է ստորև ներկայացված գրաֆիկներում:

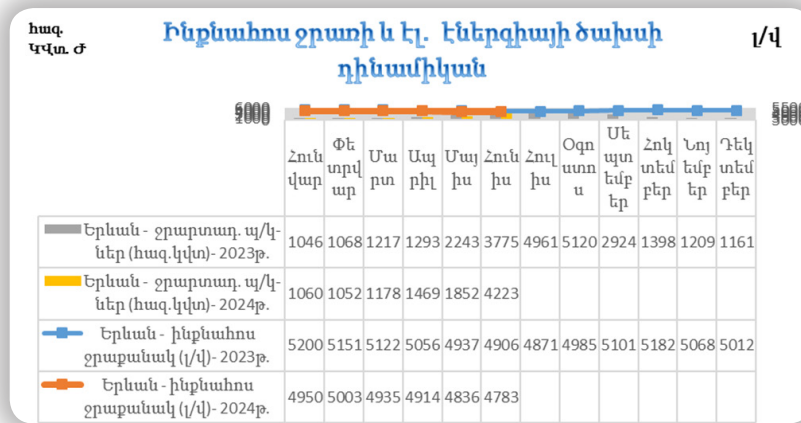

3.2. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաշվետու ամսվա ընթացքում էլ. էներգիայի ծախսը Երևան քաղաքում ավելացել է 13173 կՎտ/ժ (2.94%), այն դեպքում երբ նորակառույց շենքերի 13 պոմպակայան ավելացել է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ: Այդ 13 պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսը միայն կազմում է 4647 կՎտ/ժ, իսկ առանց այդ պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսը՝ կավելանար 8526 կՎտ/ժ:

Երևան քաղաքի բակային պոմպեր (առանց Խարբերդի պոմպակայանի)

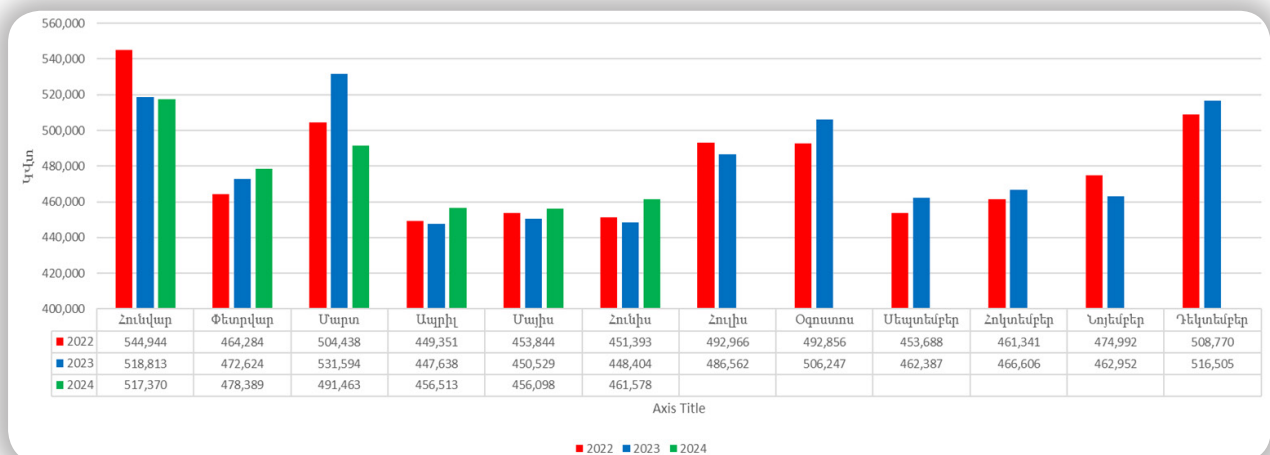

Երևան քաղաքի բակային պոմպեր

Հաշվետու ժամանակահատվածում գույքագրվել է 142 էլ. հաշվիչ: Ձևավել է 6 նոր ընդունվող պոմպակայան, Միասնիկյան պոմպակայանում ներքին հաշվառման էլ. հաշվիչը փոխարինվել է: Կազմակերպվել են երեք նոր հոսքաչափերի էլ. սնուցման աշխատանքները: Դիլիջան քաղաքի «Վարչական շենք» հասցեում հայտնաբերվել է 4044 կվտ/ժ հավելագրում, ինչի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն: Ամենօրյա կարգով ընթերցվել և հաշվետվություն է ներկայացվել ջրարտադրության խոշոր պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ: Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ԿՈԻՊ (կարգավորվող ուղիղ բաղադրիչում) կատարվել է առևտրային գործընթաց, որի արդյունքում տնտեսվել է 2,729,687 ՀՀ դրամ (առանձ ԱԱՀ): Կատարվել է էլ. էներգիայի հաշվառում, գործարքների արդյունքում ձևավորված ակտերի ստուգում, հաստատում:

Պոմպակայանների ուսումնասիրություն

Թվով 49 խոշոր պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում 37 պոմպակայանում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:

Թվով 422 բակային պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում թվով 412 հասցեում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:


Ինվերտորների տեղադրում

- Հաշվետու ամսում չորս հասցեներում տեղադրվել է ինվերտորային համակարգ.
- Շինարարների 15 (Ma-83)
- Ղանդիլյան 28դ (Shir-75)
- Ֆրունզե 8/1 18 (She-110)
- Կարբի խ/հ (Asht-2)

Ինվերտորային պոմպի տեղադրում

- Հաշվետու ամսում չորս հասցեներում տեղադրվել է ինվերտորային պոմպ.
- Բազրատունյաց 25/27 (She-82)
- Չեխովի 56 (She-22)
- Արտաշիսյան 86 (She-120)
- Ազատության 3/1 (Ar-87)

Տեղադրված ընդհանուր 142 ինվերտորային համակարգով պոմպերի սպառած էլ. էներգիան, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 129,799 կՎտ/ժ-ով՝ 18%-ով:

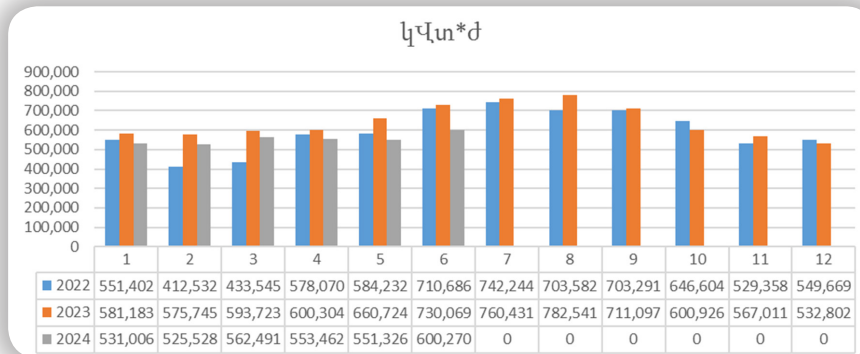


Խոշոր պոմպակայանների էլեկտրաէներգիայի խափանումներ

■ Հաշվետու ժամանակահատվածում 46 խոշոր պոմպակայաններում էլ. մատակարարման խափանումներն օպերատիվ կերպով շտկվել են, իսկ առաջացած թերությունները՝ հայտնաբերվել և վերացվել:

Երևան քաղաքի՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլեկտրաէներգիան


■ 2024թ. հունիս ամսին Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայաններում էլ. էներգիայի ծախսն ավելացել է 434 374 կՎտ/ժամ (11,13%)՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլեկտրաէներգիա

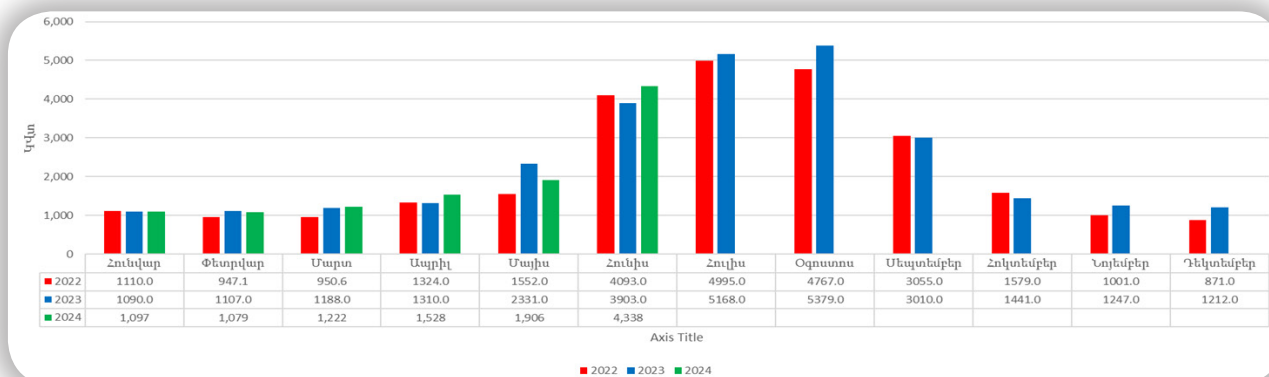

■ Ջրարտադրության պոմպակայաններում (մարզեր) էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 113 470 ԿՎտ/ժ/ամիս կամ 4,81%՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:


Մարզերի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլեկտրաէներգիա

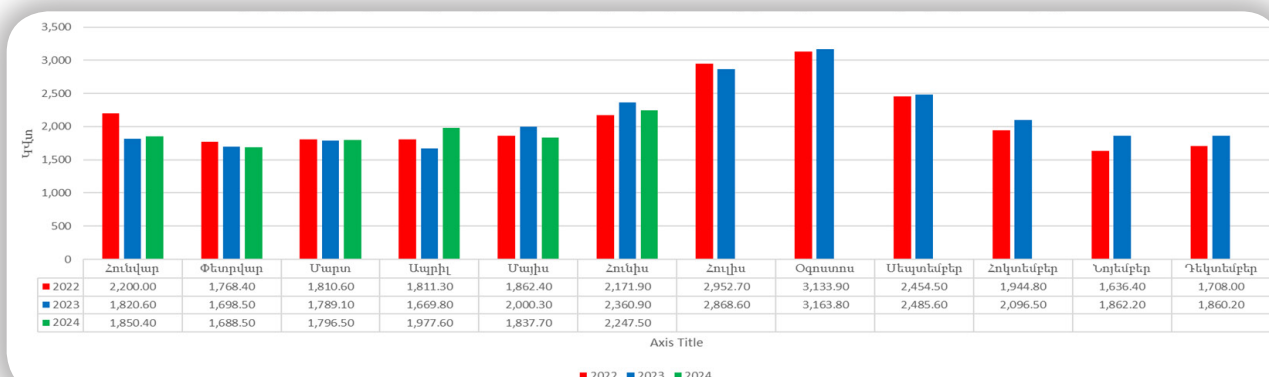

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլ. էներգիան

■ Ընդհանուր էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 624 420 ԿՎտ/ժամ 11,27%՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլեկտրաէներգիան

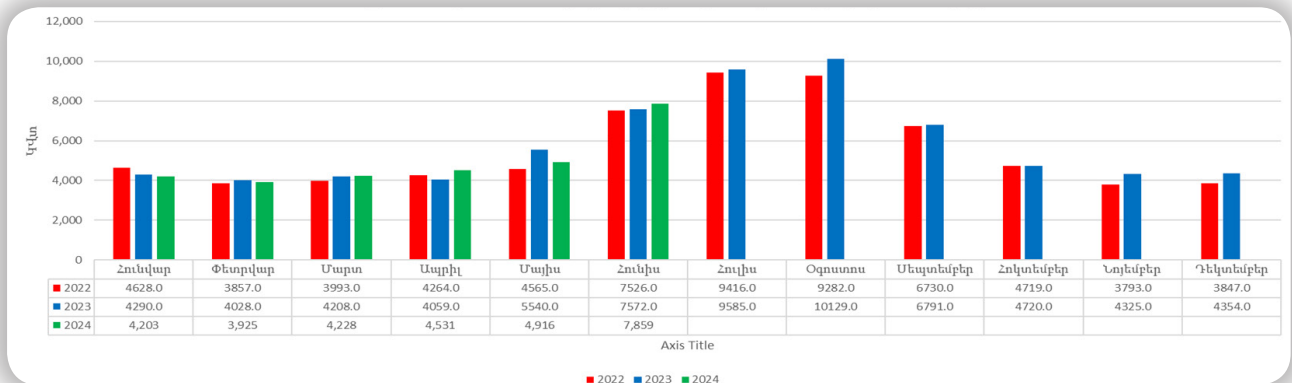

3.3. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ստորև աղյուսակում ներկայացվում են հունիս ամսվա ընթացքում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգում կատարված աշխատանքները.

Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ
Մարզային ջրագծերի ամբողջական տարանջատում՝ ըստ ջրատարերի, ջրագծերի, միացումների	տարանջատում	1
Ստեղծվել է բաժանորդ կետերի և ջրագծերի անհայտ միացումների նախնական տեղաբաշխում ըստ ամենամոտիկ ջրագծերի	տեղաբաշխում	1
Կատարվել նախնական DMA, Pressure zone տարանջատում Երևան քաղաքում հիմք ընդունելով «ԱՏՀ» տվյալները	քաղաք Երևան	1
Տեխնիկական պայմանների դիմումների վերաբերյալ դիմորդի տարածքի տեղադիրքի թվայնացում, կազմվում է քարտեզ՝ տարածքում առկա կոմունիկացիաներով, որը մուտքագրվում է փաստաթղթաշրջանառություն: Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է 225 գործի թվայնացում՝ 459 բաժանորդ	բաժանորդ	459
«ԱՏՀ»-ում առկա Երևան քաղաքի ջրագծերի և ջրատարների երկարությունը կազմում է 2849 կմ	կմ	2849
«ԱՏՀ»-ում առկա մարզային ջրագծերի և ջրատարների երկարությունը կազմում է 9700 կմ	կմ	9700
«ԱՏՀ»-ում առկա Երևան քաղաքի ընդհանուր կոյուղու երկարությունը կազմում է 1858 կմ	կմ	1858
«ԱՏՀ»-ում առկա մարզային կոյուղու երկարությունը կազմում է 1866 կմ	կմ	1866
«Բնտերակտիվ» համակարգում ֆիզիկական նոր կետերի ավելացում	կետ	1
«Բնտերակտիվ» համակարգում իրավաբանական նոր կետերի ավելացում	կետ	281
«Բնտերակտիվ» համակարգում ֆիզիկական բաժանորդ կետերի ուղղում	կետ	1456
«Բնտերակտիվ» համակարգում իրավաբանական բաժանորդ կետերի ուղղում	կետ	4

3.4. ՋՐԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Գառնի-Երևան ջրատարի վրա՝ Նուբարաշենի ձորում հայտնաբերվել է վթար 10լ/վ մեծությամբ, որը վերացվել է ՇՏ աշխատակիցների կողմից:



Արին-Բերդ-Խարբերդ ջրատարի վրա հայտնաբերվել է վթար 15լ/վ մեծությամբ, որը վերացվել է ՇՏ կողմից:



Օրեր անց նույն ջրատարի վրա կրկին առաջացել է վթար 50լ/վ մեծությամբ: Վթարը վերացվել է:

Արզնի 2 ջրատարի վրա «Կարգավորման» բաժնի աշխատակիցների ահազանգից հետո հայտնաբերվեց վթար, որի պատճառով ջուրը քաղաք չէր հասնում: Անմիջապես կատարվեցին ջրատարի ջրազրկման աշխատանքներ և ջրատարը մեկուսացվեց քաղաքին կապող ճյուղից:



Հաշվետու ամսում կատարվել են նաև ջրաքանակների չափումներ և կարգավորումներ:

3.5 ՔԼՈՐԻ ԵՎ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ընթացիկ ամսում «Ջրառ» ծառայության կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Քաղաք Մասիս, Արարատյան 1/2 քլորակայանում նորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգ մտնող ճնշումային հում ջրի զննարկից ջրագիծը՝ հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով:



■ Քաղաք Մասիս, Արարատյան 3/4 քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար հեղուկ քլորի տրման զննարկից ջրագիծը փոխարինվել է նորերով:

■ Քաղաք Իջևան, Գետահովիտ քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով հեղուկ քլորի համակարգ մտնող ջրագծի վրայի խափանված փականը փոխարինվել է նորով:



■ Քաղաք Եղեգնաձոր, Գետափ քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով վերանորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի զննարկից ջրագիծը:

■ Քաղաք Սևան, Լճաշեն քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի շարքից դուրս եկած, հնամաշ «ալդոս» փականը փոխարինվել է նորով՝ հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով:



■ Քաղաք Երևան, Ծարավ Աղբյուր քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով մասնավոր կազմակերպության կողմից վերանորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի անսարք գազ դետեկտորը:

■ Վերանորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի քլորագծի վրա գտնվող ինժեկտորը:



■ Քաղաք Երևան, Ձորաղբյուր քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով նորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի բաժանարար հանգույցի վրայի «ալդոս» փականը:



■ Քաղաք Երևան, Ավան-Առինջ տեղամասում հետագա շահագործման նպատակով վերանորոգվել է պահեստային վակուում կարգավորիչը:



■ Քաղաք Լոռի, Ծովասար քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի վակուում կարգավորիչը վերանորոգվել է՝ հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով:

■ Քաղաք Եղեգնաձոր, Քառասուն Աղբյուր քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով վերանորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի խափանված վակուում կարգավորիչը, և շարքից դուրս եկած պոմպը փոխարինվել է նորով:



■ «Ապարան-Երևան» ջրատարի վրա կատարվել են հոսքաչափի տեղադրման աշխատանքներ:



■ Սաղմոսավան-Աշտարակ» ջրատարի վրա տեղադրվել է 400մմ-ոց գծային փական:



■ Քաղաք Իջևան, Քարքարուտ քլորակայանում փոխարինվել է 500գծ/մ, 25մմ-ոց պոլիէթիլենային քլորի տրման խողովակաշարը:





■ Տաշիր տեղամասի Նովոսելցովո քլորակայանում փոխարինվել է քլորաջրի տրման համակարգը 80գծ/մ 25մմ պ/է:

3.6 1-85 ԹԵԺ ԳԻԾ

■ Հաշվետու ամսվա ընթացքում 1-85 հեռախոսակենտրոնում գրանցվել է 54514 հեռախոսազանգ: Առևտրային բնույթի զանգերի քանակը կազմել է 11804 զանգ, որից Երևան քաղաքինը եղել է 9260 զանգ (78.4%), իսկ մարզերի ցուցանիշը 2544 զանգ (21.6%):

■ Շահագործման բնույթի զանգերի քանակը կազմել է 42710 զանգ, որից Երևան քաղաքինը՝ 30229 զանգ (70.8%), իսկ մարզերինը՝ 12481 զանգ (29.2%):



185 հեռախոսային կանչերի օրական հաշվառման հաշվեգիր

	Ստորաբաժանում	2023 չունիս	2024 չունիս	
Անհատներ	Շնչափնեղ	12566	11804	-6.06%
	Երևան	9568	9260	-3.22%
	Մարզեր	2998	2544	-15.14%
Շահագործում	Շահագործում	33874	42710	26.08%
	Երևան	25395	30229	19.04%
	Արաբկիր	3841	7180	86.93%
	Քանաքեռ-Զեյթուն	2339	2820	20.56%
	Մաշտոց	3122	3598	15.25%
	Շահումյան	5191	2748	-47.06%
	Շենգավիթ	2793	4062	45.44%
	Կենտրոն	2824	3613	27.94%
	Հյուսիս/Ավան Լոր Լորք/	2834	2776	-2.05%
	Էրեբունի	2451	3432	40.02%
	այդ թվում կոյուղու վթար	168	178	5.95%
	այդ թվում դիտահորի խցանում	4727	4037	-14.60%
	ՄԱՐԶԵՐ	8479	12481	47.20%
	Հարավ	4736	7243	52.93%
	Հյուսիս	3743	5238	39.94%
	այդ թվում կոյուղու վթար	35	406	1060.00%
	այդ թվում դիտահորի խցանում	2825	2401	-15.01%

■ 2023թ. հունիս ամսվա համեմատ՝ 2024թ հունիս ամսին 6,06%-ով նվազել է առևտրային զանգերի քանակը, իսկ շահագործման զանգերի քանակն ավելացել է 26,08%-ով:

■ 2023թ. հունիսի համեմատ՝ 2024թ հունիս ամսին 46%-ով ավելացել է ֆիքսված զանգերի քանակը, 63%-ով ավելացել է հայտարարությունների լսուժն ավտոմատ ծառայության միջոցով, իսկ 17%-ով նվազել է 5 րոպեից ավել զանգերի քանակը:

Ջրամատակարարման գրաֆիկի բողոքներ

■ 2023թ. հունիսի համեմատ՝ 2024թ. հունիս ամսին 49,74%-ով ավելացել է ջրամատակարարման զանգերի քանակը:

■ 2023թ. հունիսի համեմատ՝ 2024թ հունիս ամսին, ավելացել է հետզանգով սպասարկված զանգերի քանակը 41%-ով: 2023թ. հունիս ամսին կատարվել է 34080 հետզանգ, իսկ հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ 48022 հետզանգ:

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ամռան առաջին ամսում «Վեոլիա ջուր» ընկերության համակարգում շարունակվեցին այն բոլոր շինարարական աշխատանքները, որոնք դեռ մեկնարկել էին գարնանը: Այս տարի ընկերությունը դեռ վաղ գարնանն էր սկսել թե Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով, թե շահագործման տեղամասերի ուժերով շինարարական մեծածավալ աշխատանքները: Իսկ Հանրային կապերի ծառայությունը հենց այդ ժամանակվանից էլ իրականացրել է այդ աշխատանքների լուսաբանումը թե հեռուստաալիքների, թե ընկերության ֆեյսբուքյան էջի միջոցով:



Եվ այսպես, հունիս ամսին Ֆրի նյուզ հեռուստաալիքով և ընկերության ֆեյսբուքյան էջով լուսաբանվել են ՊԿԱԾ 2024-ով Առինջ համայնքում ընկերության սկսած շինարարական աշխատանքների 2-րդ փուլը, որով կառուցվող 9 կմ ջրագծով



հնարավոր կլինի տնտեսել վայրկյանում 20 լիտր ջուր և ապահովել համայնքի Պարույր Սևակ և Աբովյան թաղամասերում կանոնավոր ջրամատակարարում:

Մեծածավալ էին նաև Երևանի Նոր Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավան, Կենտրոն վարչական շրջանների 9 փողոցներում մեկնարկած կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքները: Ֆրի նյուզ հեռուստաալիքի, ինչպես նաև ընկերության ֆեյսբուքյան էջի միջոցով ներկայացնելով աշխատանքների ընթացքը ևս մեկ անգամ խոսվեց կոյուղին ըստ նպատակի օգտագործելու մասին՝ նշելով, որ միայն այդ դեպքում կոյուղին կլինի լիարժեք աշխատանքային:

Շատ էին նաև շահագործման տեղամասերի ուժերով իրականացվող աշխատանքների լուսաբանումը: Թե

հեռուստաընկերությամբ, թե ընկերության յությամբ,

կայքէջի և ֆեյսբուքյան էջերի միջոցով լուսաբանվեց Չարենցավան քաղաքի Շահումյան, Մարտունի քաղաքի Գետափնյա, Ծաղկաձոր քաղաքի Պահլավունյաց փողոցների, Բաղրամյան համայնքի Այգեգործական թաղամասի 7 փողոցների ջրագծերի կառուցումը: Արմավիրի մարզի Պտղունք և Մուսալեռ բնակավայրերում կառուցվելով 3700 գծամետր ջրագիծ ՎեոլիաԹիմը լուծեց տարիների ջրամատակարարման խնդիրը: Լուսաբանվեց, որ Կապան քաղաքի Հունան Ավետիսյան և Մինաս Պապյան փողոցների 1700 բաժանորդ արդեն ջուր են ստանում նոր ջրագծով: Իսկ ահա



Վարդենիս քաղաքում նորացվեցին Երիտասարդության փողոցի 14 և 16 շենքերի կոյուղագծերը:

Ամսվա ուրախալի լուրը Եղվարդի Երևանյան փողոցի տարիների պատմություն ունեցող ջրի խնդրի լուծումն էր: Այդպիսի արդյունք կանոնավոր և բարձր ճնշմամբ ջրամատակարարում այս փողոցի բաժանորդները երբեք չէին ունեցել:


Քիչ չէին գաղտնի վթարների վերացման աշխատանքները, որոնց արդյունքում մեծ ջրաքանակ տնտեսվեց Հայրավանքում, Օշականում և այլուր: Որպես այս թեմայի ամփոփում իրապարակվեց Հանրային կապերի

ծառայության կողմից նկարահանված գաղտնի վթարի պատմությունն ֆիլմը, որի միջոցով ևս մեկ անգամ սպառողներին բացատրվեց, թե որն է գաղտնի վթարը, ինչպես է այն հայտնաբերվում և վերացվում:

Ամսվա խոշոր վթարներ էին «Ղազանչի 2» ջրատարի վթարը, որին Հանրային կապերի ծառայությունը անդրադարձավ 2 անգամ: Իսկ ամսվա վերջում Կորեայի ձորում վթարվեց «Արզնի 2» ջրատարը՝ 400 լիտր ջրակորստով: Վեոլիաթիմը աշխատեց գիշեր-ցերեկ և 36 ժամ հետո կարողացավ վերականգնել Արաբկիր վարչական շրջանի ջրամատակարարումը: Հանրային կապերի ծառայությունը այդ ընթացքում հրապարակումներով, լրագրողների հետ առանձին աշխատանքներով կարողացավ մեղմել դեպի ընկերություն մղվող բացասական ալիքը:

Հաշվետու հունիս ամսին շարունակվեցին Լոռու և Տավուշի մարզերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին աղետի պատճառած վնասների գույքագրման, հայտնաբերման և վերացման աշխատանքները: Աղետի գոտում Վեոլիաթիմի իրականացրած աշխատանքներին պարբերաբար պատկան մարմիններից հնչել են շնորհակալական և գովեստի խոսքեր, որոնք տեղադրվել են ընկերության ֆեյսբուքյան էջում:

Ամռանը, երբ ջրի աճող պահանջարկը բավարարելու համար «Վեոլիա Ջուր» ընկերության համակարգն աշխատում է գերլարված, գործարկված են բոլոր պոմպակայանները, ամեն ինչ արվում է սպառողների կանոնավոր ջրամատակարարումն ապահովելու համար, այնուամենայնիվ կան հազարավոր սպառողներ, որոնց կատարած խախտումները զգալի վնաս են պատճառում թե՛ ընկերությանը, թե՛ օրինապաշտ բաժանորդներին: Խոսքը ապօրինի ջրօգտագործողների մասին է, որոնք շարունակում են ջրագողությամբ զբաղվել: Հանրային կապերի ծառայությունը այս թեմայով կատարած մի քանի հրապարակումներով ցույց է տալիս, որ շոգ եղանակին ջրի սպառման ծավալների ավելացմանը զուգահեռ ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտումների պատճառը մեծ մասամբ հենց այս ապօրինություններն են: Հունիս ամսին շատ են եղել հրապարակումներ ընկերության կարիքների համար պահանջվող ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարման, վթարային ու պլանային ջրանջատումների մասին:

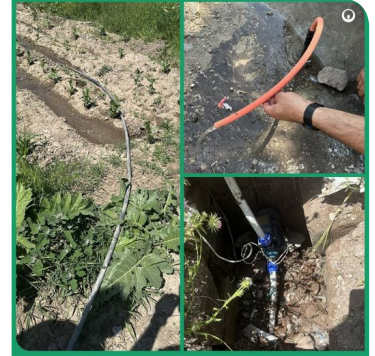

ՈՐԱԿԻ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

5.1. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ/ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

■ «Առողջության և Անվտանգության» պայմանագրի երկրորդ կետով և Վեոլիա Գրուպի ընթացակարգերով սահմանված պահանջներով երկրորդ եռամսյակի ընթացքում Ընկերության Հյուսիս և Հարավ Շահագործման տնօրինություններում շահագործման տեղամասերի պետերի կողմից իրականացվեցին Վեոլիա Գրուպի Կյանքը փրկող կանոնների վերաբերյալ հանդիպում/քննարկումներ թվով 285 աշխատակցի հետ:



■ ՈԱԱ Բաժինը (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ), ղեկավարվելով Ընկերության Գլխավոր տնօրենի 2022 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02Լ հրամանի և հրամանին կից կարգի պահանջներով, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի և 254-րդ հոդվածի պահանջներով, ինչպես նաև Հայաստանի հանրապետության Տեխնիկական կանոնակարգերի և Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 595-Ն հրամանով հաստատված «Հրդեհային անվտանգության կանոնների» 454-րդ կետի 6-րդ ենթակետի պահանջներով, «Որակավորում եռակցողների. Պողպատի եռակցում հալումով ՄԱՍ 1» ստանդարտի պահանջներով, ինչպես նաև Վեոլիա Գրուպի Բարձր ռիսկերի կառավարման ստանդարտի պահանջներով, Ընկերության Տեխնիկական, Հյուսիս, Հարավ և Երևան շահագործման տնօրինությունների թվով 7 աշխատողի համար կազմակերպեց և իրականացրեց ստորև ներկայացվող 4 մոդուլից բաղկացած դասընթացները և գիտելիքների ստուգումը:

■ «Էլեկտրագազաեռակցման աշխատանքներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ թեմայով դասընթաց և գիտելիքների ստուգում»,

■ «Առաջին օգնություն ցուցաբերելու եղանակները»,

■ Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում» ԲՌԿ ստանդարտի պահանջներ,

■ Կյանքը փրկող կանոններ թեմաներով դասընթացները:




■ ՈԱԱ Բաժինը, հիմք ընդունելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 21/04/2011 թվականի N 529-Ն որոշմամբ սահմանված «Քլորի արտադրության, օգտագործման, պահման և փոխադրման ժամանակ անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի» պահանջները, ինչպես նաև Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում» բարձր ռիսկերի կառավարման ստանդարտի և «Կյանքը փրկող կանոններ»-ի (LRS) պահանջները Հնկերության Տեխնիկական տնօրինության թվով 25 աշխատողի համար կազմակերպեց և իրականացրեց ստորև ներկայացվող 4 մոդուլից բաղկացած դասընթացները և գիտելիքների ստուգումը

■ «Քլորակայաններ շահագործող, սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական որակավորում և գիտելիքների ստուգում»,

■ «Առաջին օգնություն ցուցաբերելու եղանակները»,

■ Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում» ԲՌԿ ստանդարտի պահանջները,

■ Վեոլիա Գրուպի «Կյանքը փրկող կանոնները» թեմաներով դասընթացները:



■ ՈԱԱ Բաժինը, հիմք ընդունելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 21/04/2011 թվականի N 529-Ն որոշմամբ սահմանված «Քլորի արտադրության, օգտագործման, պահման և փոխադրման ժամանակ անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի» պահանջները, ինչպես նաև Վեոլիա Գրուպի «Կյանքը փրկող կանոններ»-ի (LRS) պահանջները Հնկերության Տեխնիկական տնօրինության թվով 13 աշխատողի համար կազմակերպեց և իրականացրեց ստորև ներկայացվող 3 մոդուլից բաղկացած դասընթացները և գիտելիքների ստուգումը.

■ «Քլորակայանի պատասխանատու անձի մասնագիտական որակավորում և գիտելիքների ստուգում»,


■ «Առաջին օգնություն ցուցաբերելու եղանակները»,

■ Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում» ԲՌԿ ստանդարտի պահանջները,


■ Վեոլիա Գրուպի «Կյանքը փրկող կանոնները» թեմաներով դասընթացները:



2023-2024թթ. կազմակերպված դասընթացներին/հրահանգավորումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակների համեմատական գրաֆիկ

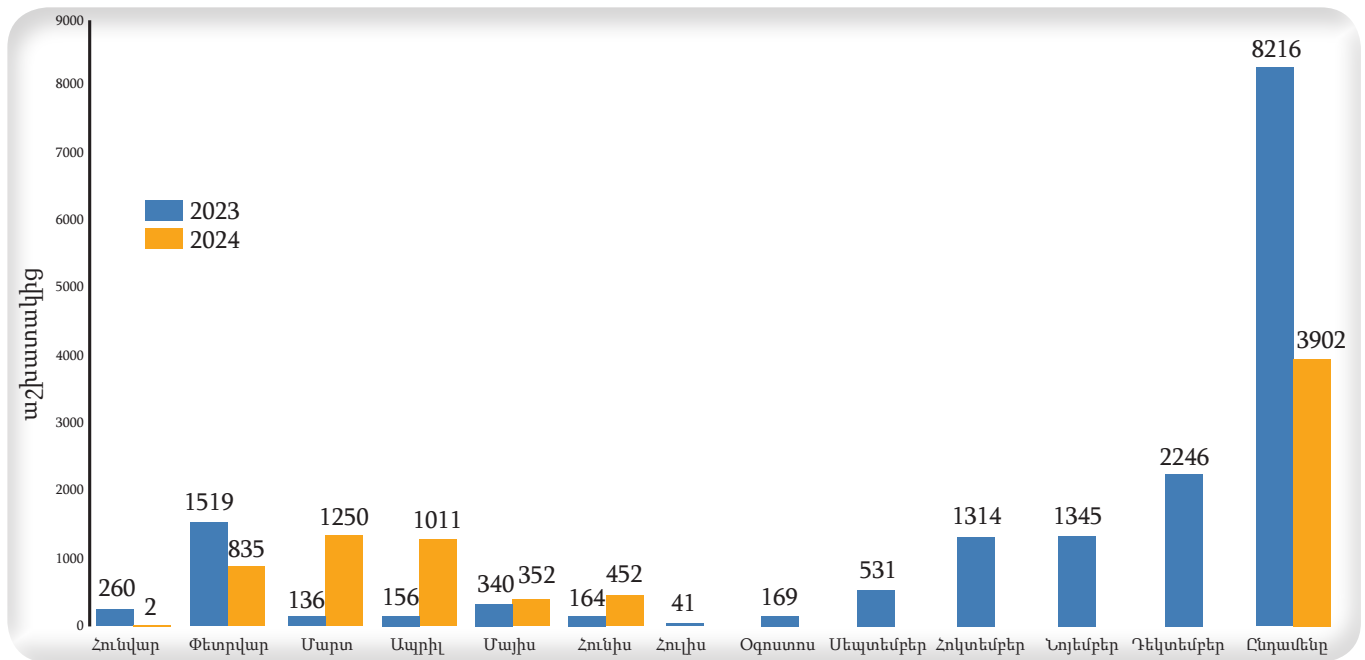

2023-2024թթ. կազմակերպված դասընթացներին/հրահանգավորումներին ժամային համեմատական գրաֆիկ

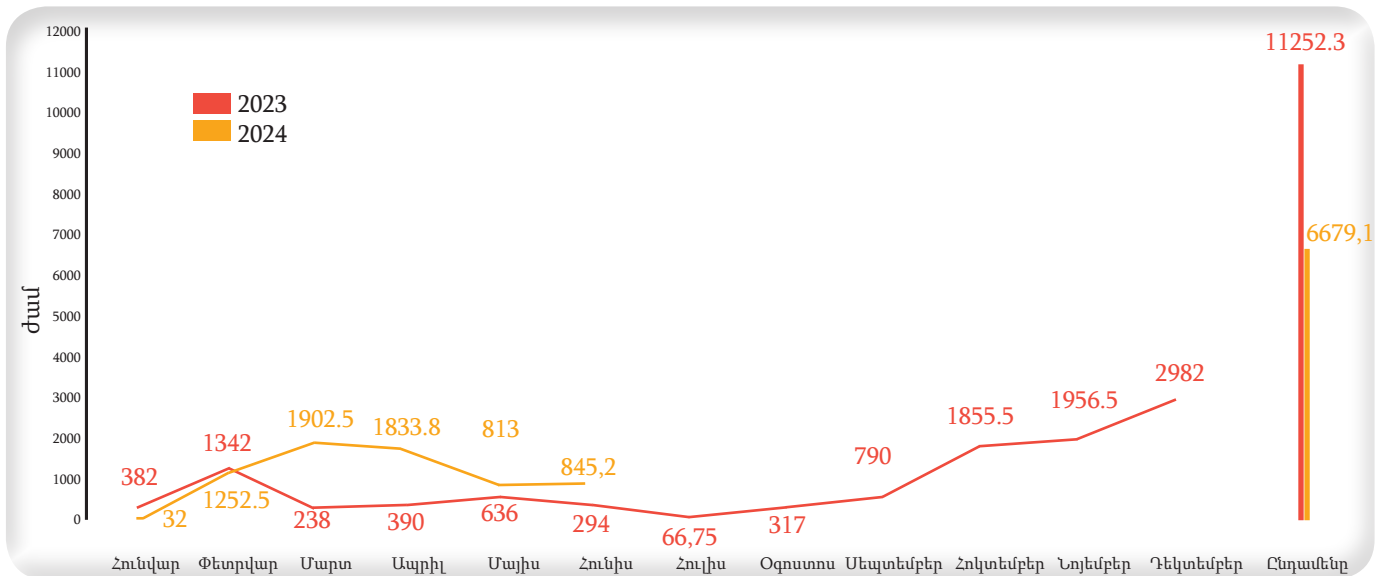


5.2. ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ/ՄԵՂՄԱՅՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

■ Բաժնի անվտանգության պատասխանատուներն իրականացրեցին անվտանգության ստուգայքեր Ընկերության թվով 3 քլորակայանում: Ստուգայքերի նպատակն էր իրականացնել ռիսկերի գնահատում և կառուցվածքները շահագործող անձնակազմերի կողմից Ընկերությունում հաստատված անվտանգության հրահանգների պահանջների կատարման որակի մոնիթորինգ:

■ ՈԱԱ Բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են Հնկերության ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերում իրականացվող թվով 58 վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում տեղամասերի վթարավերականգնողական աշխատանքային խմբերի կողմից անվտանգության հրահանգների պահանջների կատարման որակը, տեղում տրվել են ցուցումներ անվտանգության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման՝ մասնավորապես ԱՊՄ-ների կիրառման, մշակվող խրամուղիների պարագծով գծանշման, ծանր տեխնիկայի շահագործման ուղղությամբ, ինչպես նաև արձանագրված թերությունների վերաբերյալ կազմվեցին հաշվետվություններ և ներկայացվեցին Հնկերության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին՝ արձանագրված թերությունների շտկման նպատակով:

2024 թ. իրականացված անվտանգության ստուգայցների քանակներն ըստ օբյեկտների

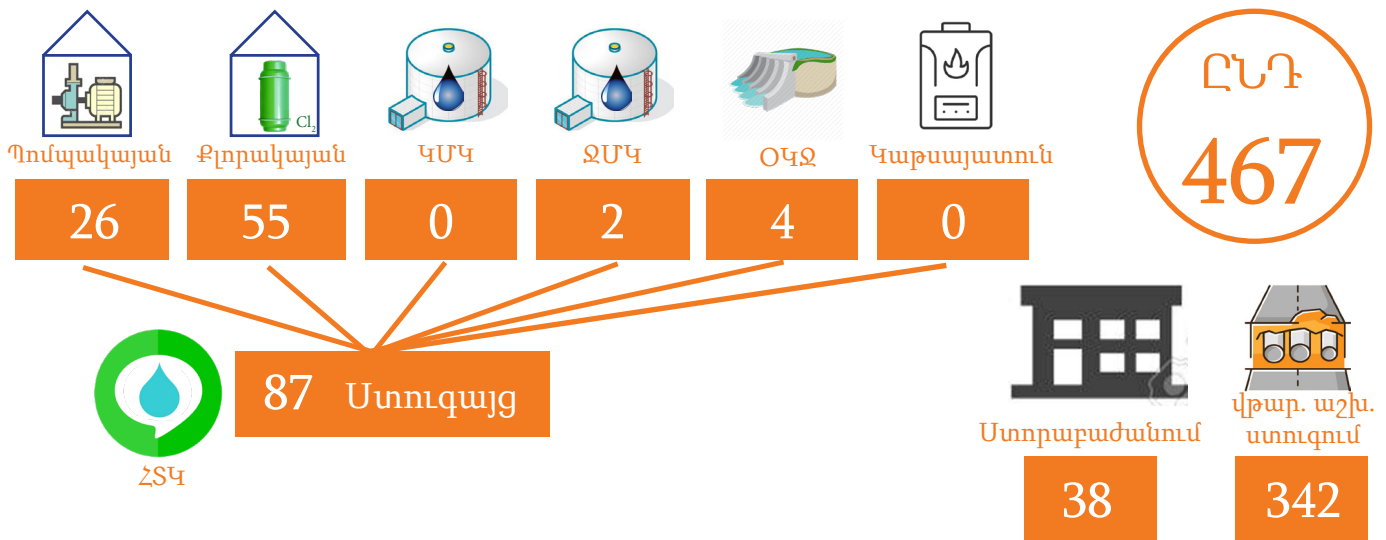

5.3 ՔԼՈՐԻ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԼՈՆԻ ԳԱԶԱԶԵՐԾՄԱՆ (ԴԵԳԱԶԱՑԻԱՅԻ) ՓԶԱՄԱՔՐՄԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

■ Հաշվետու ժամանակահատվածում, ՈԱԱ բաժինը, ՏՏ Ջրատ ծառայության հետ համատեղ, կազմակերպել է հեղուկ քլորի տարողությունների՝ թվով 10 կոնտեյների և թվով 32 բալոնի տեխնիկական վկայագրման աշխատանքներ, որը իր մեջ ներառում է ստորև ներկայացվող աշխատանքները.

- Քլորի տարողության գազագերծման (դեգազացիա) և փչամաքրման աշխատանքներ
- Քլորի տարողության արտաքին ակնադիտական զննում,
- Քլորի տարողության ներքին լապարասկոպիկ զննում,
- Քլորի տարողության մետաղի հաստության որոշում,
- Քլորի տարողության մետաղի կարծրության որոշում,
- Քլորի տարողության փորձարկային ճնշումով պնևմատիկ փորձարկում,
- Քլորի տարողության փականային արմատուրների, կցաշուրթերի, սիֆոնների ստուգում,
- Քլորի տարողության կիպության փորձարկում աշխատանքային ճնշման տակ,
- Քլորի տարողության ներկման աշխատանքներ:



5.4. ՎԵՈՒԽԱ ԳՐՈՒՊԻ ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

■ Հաշվետու ամսում իրականացվել է Վեոլիա Գրուպի «Փոստրակների և խրամուղիների» նոր խմբագրության Բարձր Ռիսկերի կառավարման ստանդարտի հայերեն լեզվով թարգմանության և ադապտացման աշխատանքներ:

5.5. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՆԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

■ Համաձայն ՆԳ նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, ներքին գործերի նախարարի տեղակալի գրության, ՈԱԱ Բաժինը, «Հյուսիս» շահագործման տնօրինության «Շիրակ» շահագործման տեղամասի հետ համատեղ մասնակցեց «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Շիրակի մարզում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով Շտաբային ուսումնասվարժությանը:

5.6. ՎԵՈՒԽԱ ԳՐՈՒՊԻ ԵՎ «ՎԵՈՒԽԱ ԶՈՒՐ» ՓԲԸ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

■ «Առողջության և Անվտանգության» պայմանագրի առաջին կետով և Վեոլիա Գրուպի ընթացակարգերով սահմանված պահանջներով, Ընկերության ղեկավար անձնակազմի կողմից՝ եռամսյակը մեկ անգամ, Ընկերության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներում, Վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացման վայրերում, Վարչական շենքերում և Ընկերության այլ տարածքներում անհրաժեշտ է իրականացնել անվտանգության ստուգայցներ և ստուգայցների վերաբերյալ ներկայացնել զեկույցներ՝ արձանագրված թերությունների շտկման/վերացման նպատակով:

Երկրորդ եռամսյակի համար սահմանված ստուգայց/զեկույցները իրականացվել են 100 տոկոսով:

■ «Առողջության և Անվտանգության» պայմանագրի երկրորդ կետով և Վեոլիա Գրուպի ընթացակարգերով սահմանված պահանջներով, Շահագործման տեղամասերի պետերի կողմից՝ Վեոլիա Գրուպի Կյանք փրկող կանոնների վերաբերյալ, Շահագործման տեղամասերի աշխատողների հետ 2024 թվականի ընթացքում, եռամսյակը մեկ անգամ անհրաժեշտ է անցկացնել հանդիպում/քննարկում և քննարկված կանոնների շրջանակում աշխատակիցներին ներկայացված հրահանգների, ցուցումների և քննարկված հարցերի վերաբերյալ ներյայացնել զեկույց:

Երկրորդ եռամսյակի համար սահմանված զեկույցները իրականացվել են 100 տոկոսով:

■ «Առողջության և Անվտանգության» պայմանագրի երրորդ կետով և Վեոլիա Գրուպի ընթացակարգերով սահմանված պահանջներով, Ընկերությունը 2024 թվականի ընթացքում պետք է իրականացնի նոր խմբագրության թվով 5 ԲՌԿ ստանդարտի ինքնագնահատման աշխատանքներ:

Աշխատանքներն իրականացվում են ըստ սահմանված ժամանակացույցի:

■ «Առողջության և Անվտանգության» պայմանագրի չորրորդ կետով և Վեոլիա Գրուպի ընթացակարգերով սահմանված պահանջներով, ՈԱԱ Բաժնի և ընկերության ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից 2024 թվականի ընթացքում պետք է արձանագրեն թվով 100 գրեթե պատահար և Hi Po:

Երկրորդ եռամսյակի համար սահմանված գրեթե պատահարի և Hi Po-ների արձանագրումն իրականացվել է 100 տոկոսով:

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ
ՀՀ, 0014, ք.երևան, Ն.Ադունցի 6/1
ՀՀ, 0025, ք.երևան, Արուսյան 66ա
E-mail: info@vjur.am
