

ՕԳՈՍՏՈՍ 2024

**ԱՄՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

1. Շահագործման տարածաշրջանի տնօրինություններ	3
1.1. Ջրամատակարարման համակարգի կառավարում	3
1.2. Ջրաչափերի փոխարինում և տեղադրում	8
1.3. Ջրահեռացման համակարգ	9
1.4. Կեղտաջրերի մաքրում և հեռացում	10
1.5. Էներգահամակարգ	10
 2. Առևտրային տնօրինություն	11
2.1. Բաժանորդների տվյալներ	11
2.2. Հասույթ	12
2.3. Գանձում	13
2.4. Դեֆիտորական պարտքեր /Իրավաբանական վարչություն/	13
2.5. Ջրաչափեր	14
2.6. Ապօրինի միացումների հայտնաբերում և վերացում	15
 3. Տեխնիկական տնօրինություն	16
3.1. Ջրամատակարարման շարունակականություն	16
3.2. Էլեկտրաէներգիայի կառավարում	17
3.3. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ	20
3.4. Ջրատար համակարգի բարելավում	20
3.5. Քլորի և խմելու ջրի մաքրման կայանների ծառայություն	21
3.6. 1-85 թեժ գիծ	22
 4. Լրատվական ծառայություն	23
 5. Որակի, առողջության և անվտանգության բաժին	25
5.1. Դասընթացներ/սեմինարներ	25
5.2. Ռիսկերի հայտնաբերում/մեղմացնող միջոցառումների կիրառում	26
5.3 Քլորի տարողությունների՝ կոնտեյների և բալոնի գազագերծման (դեգազացիայի) փչամաքրման, տեխնիկական վկայագրման և ներկման աշխատանքներ	27
5.4. Բժշկական զննություններ և հետազոտություններ	28
5.5. ԱՊՄ-ների և ԿՊՄ-ների ձեռքբերման և բաշխման աշխատանքներ	28

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.1 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաշվետու ժամանակահատվածում Վեդլիա Ընկերության սպասարկման տարածքում իրականացվել են վթարա-
որոնողական և ջրագծերի և կոյուղագծերի վերակառուցման, ջրակորուստների հայտնաբերմանն ու վերացմանն
ուղղված աշխատանքներ, մասնավորապես

Գյուղ Հովունի

■ Ջրաքանակը կարգավորելու համար Շիրակ տեղամասի սպասարկման տակ գտնվող Զույգաղբյուրի $D = 700$ մմ պողպատե ջրատարի վրա տեղադրվեց $D = 500$ մմ կարգավորիչ փական, որը սնուցում է Գյումրի քաղաքի
մեծ մասը այդ թվում նաև Անի թաղամասը և Ախուրյան համայնքի շուրջ 7 բնակավայրեր: Արդյունքում նշված
բնակավայրերի ջրաքանակը հնարավոր եղավ կարգավորել ըստ պահանջարկի:



Քաղաք Գյումրի

■ Շիրակ տեղամասի Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասը սնուցող ջրագծի վրա իրականացված
ուսումնասիրությունների արդյունքում որոշում կայացվեց փոխարինել շուրջ 30 տարի շահագործվող հին,
 $D=300$ մմ ՃԿՓ-ն նույն տրամագծի նոր ՃԿՓ-ով: Փոխարինվեց նաև սնուցող $D=225$ մմ ՊԷ ջրագիծը, ՃԿՓ-ից
դեպի էլ.մագնիսական հոսքաչափ ընկած հատվածը $D=200$ մմ $L=9$ մ պողպատե ջրագծով: Խցափակվեց դեպի
հին ջրամատակարարման ցանց
գնացող $D=600$ մմ ջրագիծը,
իննայվեց $Q=15$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Նորաշեն գյուղում իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց թվով 2 վթար Հացառատ-Լճաշեն $D=500$ մմ ջրատարի վրա մասնավորապես Նորաշեն գյուղի դաշտերի մեջ $Q=2$ լ/վ ջրաքանակով, իսկ մյուսը՝ Նորաշեն գյուղի ներքին ցանցում գաղտնի վթար $D=63$ մմ պե ջրագծի վրա $Q=3$ լ/վ ջրաքանակով: Արդյունքում տնտեսվեց ընդհանուր $Q=5$ լ/վ ջրաքանակ:



Գյուղ Ջրատատ

■ Կոտայքի մարզի Ջրատատ գյուղում իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար դիտահորի մեջ $D=110$ մմ պե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q=5$ լ/վ ջրաքանակ:




■ Մեղրի քաղաքում իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց թվով 2 վթար Զվար-Մեղրի $D = 219$ մմ պողպատե ջրատարի վրա: Վթարները վերացնելուց հետո տնտեսվեց ընդհանուր $Q=13$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Գորիս քաղաքում իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց վթար Մաշտոցի փողոց 5 հասցեի հարևանությամբ, $D=110$ մմ ՊԷ ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q=1$ լ/վ ջրաքանակ:

Գյուղ Բերդիկ

■ Արտաշատ տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց թվով 2 վթար և անհայտ միացում Բերդիկ գյուղը սնուցող $D=100$ մմ ջրագծի վրա: Արդյունքում տնտեսվեց $Q=4$ լ/վ ջրաքանակ:



Քաղաք Մեծամոր

■ Արմավիր տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված վթարադրոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց շուրջ 10 գաղտնի վթար Մեծամոր քաղաքի ջրամատակարարման ցանցում, այդ թվում 2-րդ, 4-րդ և «Ժամանակավոր տնակներ» թաղամասում: Նշված վթարները վերացնելու և ջրաքանակների չափումների արդյունքում պարզվեց, որ տնտեսվել է ընդհանուր $Q=17$ լ/վ ջրաքանակ և հաջողվել է ապահովել 24-ժամյա կայուն ջրամատակարարում:



Քաղաք Դիլիջան

■ Դիլիջան տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց Վասիլ փողոցով անցնող $D=63$ մմ ՊԷ ջրագծից միացված $D=25$ մմ անհայտ միացում:



Քաղաք Ստեփանավան



■ Ստեփանավան տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Սուրբ Նշան փողոցով անցնող $D=500$ մմ պողպատե ջրագծի վրա: Վթարը վերացնելուց հետո տնտեսվեց $Q=1.5$ լ/վ ջրաքանակ:


Քաղաք Երևան

■ Շահումյան տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Շերամի 11 և 13 շենքերը սնող $D=80$ մմ ջրագծի վրա: Կատարվեց վթարված ջրագծի շրջանցում $D=110$ մմ $L=60$ մ ջրագծով: Արդյունքում տնտեսվեց $Q=2$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Շահումյան տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Հաղթանակ-Մերձավան $D=200$ մմ ջրագծի վրա: Կատարվեց վթարված ջրագծի ներանցում $D=75$ մմ ՊԷ ջրագծով: Արդյունքում տնտեսվեց $Q=11$ լ/վ ջրաքանակ:

■ Մաշտոց տեղամասի աշխատակիցների հետ տեսանկարահանող սարքի միջոցով իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գաղտնի վթար Արզումանյան 24 շենքի հարևանությամբ անցնող $D=100$ մմ պողպատե ջրագծի վրա: Արդյունքում տնտեսվեց $Q=4$ լ/վ ջրաքանակ:



■ Կենտրոն տեղամասի աշխատակիցների հետ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվեց թվով 3 գաղտնի վթար Ռաֆայելյանների 60 տան մոտով անցնող $D=63$ մմ ՊԷ ջրագծի վրա: Արդյունքում տնտեսվեց $Q=3$ լ/վ ջրաքանակ:

■ Քաղաք Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Մ. Ավետիսյան 4 փողոցի ջրամատակարարումն իրականացվում էր $d=80$ մմ պողպատե խողովակով, որի $L=100$ գծ/մ հատվածը ամբողջովին քայքայված վիճակում էր, հաճախակի էին կրկնվող վթարները: «Արաբկիր» ՇՏ աշխատակիցների կողմից քայքայված ջրագծի վրա փոխարինվել է $d=63$ մմ $L=100$ գծ/մ պոլիէթիլենային խողովակով: Կատարված աշխատանքների արդյունքում Մ. Ավետիսյան 4 փողոցի ջրամատակարարումը կարգավորվել է և գործում է անխափան:



■ «Հարավ» տեղամասի աշխատակիցների կողմից Մ. Արարատ, համայնք Դիտակ, Վ. Սարգսյան փողոց 11 տան դիմաց $d=63$ մմ $L=50$ գծ/մ շարքից դուրս եկած պոլիէթիլենային ջրագիծը փոխարինվել է նոր $d=63$ մմ պոլիէթիլենային խողովակներով:



■ «Հարավ» տեղամասի աշխատակիցների կողմից Սուվորովի փողոց 105 տան մոտ $d=80$ մմ $L=29$ գծ/մ քայքայված պողպատե ջրագիծը փոխարինվել է $d=63$ մմ պոլիէթիլենային խողովակներով:

Գեղարքունիքի մարզ

■ «Մարտունի» տեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով, ինչպես նաև 2024 ՊԿԱԾ շրջանակներում ք.Մարտունի, Նարեկացի փողոցում և Նարեկացի փողոցի նրբանցքներում և փակուղիներում վերակառուցվել են $d=25-40-63-160$ մմ, $L=980$ գծմ պեթ ջրագծեր, տեղադրվել է թվով 25 ջրաչափական դիտահոր և թվով 25 $d=20$ մմ բրոնզե փական, սահմանագատման կետերում և նոր տեղադրված ջրաչափական դիտահորերում տեղադրվել և վերատեղադրվել է թվով 25 ջրաչափական սարք, շահագործումից հանվել են $L=950$ գծմ վթարային վիճակում գտնվող մետաղական ջրագծեր:

Կատարված աշխատանքների արդյունքում ք.Մարտունի, Նարեկացի փողոցում և Նարեկացի փողոցի նրբանցքներում և փակուղիներում բարելավվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, ապահովվել է սպասարկվող բաժանորդների անխափան ջրամատակարարում, տնտեսվել է մոտ 4,5 լ/վրկ ջրաքանակ, կատարվել է ցանցի աշխատանքների ճիշտ կազմակերպում:



Արմավիրի մարզ

■ «Արմավիր» տեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում Արմավիր մարզի Բաղրամյան գյուղի 1 980-ական թվականներին կառուցված Չարենցի փողոցի $d=100$ մմ $L=520$ գծմ խիստ վթարային վիճակում գտնվող թուջե ջրագիծը փոխարինվել է $d=75$ մմ պեթ խողովակով: Ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների ընթացքում թվով 6 բաժանորդից թվով 5-ի ջրաչափական դիտահոր դուրս է բերվել սեփականություն հանդիսացող տարածքներից և թվով 3 ջրաչափ փոխարինվել է նոր $d=15$ մմ ջրաչափերով, ինչպես նաև Բաղրամյան գյուղի Այգեգործական ընկերությունը սնող 1980-ական թվականներին կառուցված $d=50-80$ մմ $L=2630$ գծմ կողոզիայի ենթարկված ջրագիծը փոխարինվել է $d=90$ մմ խողովակով: Ջրագծերի փոխարինման աշխատանքների ընթացքում թվով 3 բաժանորդից թվով 1 բաժանորդի ջրաչափական դիտահորը դուրս է բերվել սեփականություն հանդիսացող տարածքից, իսկ 2 բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը գտնվել են սահմանագատման կետում: Ջրագծերի փոխարինման արդյունքում վերացվել են գաղտնի վթարները, տնտեսվել է 2,5-3 լ/վրկ. ջուր:



■ Արմավիրի մարզի Դալարիկ գյուղի Զ.Անդրանիկի փողոցի 2003թ. կառուցված $d=100$ մմ $L=910$ գծմ խիստ վթարային վիճակում գտնվող պողպատյա ջրագիծը փոխարինվել է $d=110$ մմ պեթ խողովակով: Ջրագծի փոխարինման աշխատանքների ընթացքում ընդհանուր թվով 10 բաժանորդից թվով 7 բաժանորդի ջրաչափական դիտահոր դուրս է բերվել սեփականություն հանդիսացող տարածքներից, որից թվով 5 ջրաչափ փոխարինվել է նոր $d=15$ մմ ջրաչափերով: Թվով 10 բաժանորդի վթարային վիճակում գտնվող մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե խողովակներով: Աշխատանքների իրականացման արդյունքում վերացվել են գաղտնի վթարները, տնտեսվել է 3-4 լ/վրկ. ջուր:



■ «Էջմիածին» ենթատեղամասի աշխատակիցների կողմից փոխարինվել է ք.Էջմիածին, Ա.Մանուկյան թաղամասի չփոխարինված ջրագծի $L=180$ գծմ հատվածը թաղամասին ապահովելով բարձր ջրի ճնշում:



Ջրահեռացման համակարգ

Սյունիքի մարզ

■ «Մեղրի» տեղամասի աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում ք.Մեղրի, Գործարանային փողոցում վերակառուցվել է նոր $d=150$ մմ պեթ երկշերտ ծալքավոր $L=100$ գծմ կոյուղագիծ, որը գործում է անխափան:



Գեղարքունիքի մարզ

■ «Գավառ» տեղամաս. Հասցեների ջրահեռացումը տարիներ շարունակ իրականացվել է առվակի հունով: Խնդրին տրվեց հիմնական լուծում՝ աշխատակիցների կողմից սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվեց ք.Գավառ, Ա.Ոսկանյան փողոցի $d=200$ մմ $L=42$ գծմ կոյուղագիծը:



Արարատի մարզ

■ Արարատի մարզի ք.Արտաշատ, Ն.Ստեփանյան փողոցում «Արտաշատ» տեղամասի աշխատակիցների սեփական ուժերով ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է $d=250$ մմ, $L=150$ գծմ կոյուղագիծ, տեղադրվել է թվով 4 $H1000 \times D1000$ մմ երկաթբետոնյա դիտահոր, թվով 4 1200×1200 մմ երկաթբետոնյա ծածկ: Կատարված աշխատանքների արդյունքում բարելավվել է ք.Արտաշատ, Ն.Ստեփանյան փողոցի ջրահեռացման համակարգը, վերացել են դիտահորերի հաճախակի խցանումները, ապահովվել է սանիտարահիգիենիկ բարվոք վիճակ:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում կատարված աշխատանքները հակիրճ նկարագրվում են Աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

Կատարված աշխատանքները	Չափման միավոր	Քանակ
Չափում հոսքաչափով	տեղ	1026
Որոնում խողովակափնտրիչ սարքով	մ	19272
Հոսակորուստի որոնում ակվաֆոնով	մ	28062
Հոսակորուստի որոնում կորեյատորով	մ	1690
Ջրաչափական հանգույցներ ուսումնասիրություն, սխեմաների կազմում	հատ	0
Շահագործումից հանված ջրագիծ	մ	6268.4
Կառուցված ջրագիծ	մ	13119.9
Կառուցված կոյուղագիծ	մ	848
Վերացված գաղտնի վթարներ	հատ	2
Փոխարինված փական	հատ	268
Տեղափոխված/փոխարինված ջրաչափական հանգույց	հատ	689
Մաքրված դիտահոր	հատ	1472
Գաղտնի վթարների վերացման արդյունքում տնտեսված ջրաքանակ	լ/վ	2.5
Վերացված վթարներ	Չափման միավոր	Քանակ
Ջրամատակարարման ցանցում	հատ	1380
Ջրահեռացման ցանցում	հատ	1478
Պոմպակայաններում	հատ	0
Մաքրված անձրևնդունիչ	հատ	0

Օգոստոս ամսվա ընթացքում վերացված վթարների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև բերված Աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Վերացված վթարների քանակային նկարագիր

	Պոլիէթիլենային խողովակներ (հատ)	Մետաղական խողովակներ (հատ)	Ցանցում շահագործման և պահպանման աշխատանքներ
Ընդամենը	1193	876	1103

1.2. ԶՐԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ստորև Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է օգոստոս ամսվա ընթացքում տեղադրված, փոխարինված կամ սահմանազատման կետեր տեղափոխված տարբեր տրամաչափերի ջրաչափերի քանակը:

Աղյուսակ 3. Տեղադրված, փոխարինված, տեղափոխված ջրաչափեր

Կատարված աշխատանքներ	Ջրաչափի տրամագիծ, մմ											Ընդամենը
	15	20	25	30	32	40	50	65	80	100		
Տեղադրված	261	18	2	0	0	1	1	0	0	0		283
Փոխարինված	673	16	9	0	5	3	9	0	3	0		718
Տեղափոխված												0
Տեխ. ակտ	195	5	5	0	3	2	3	0	1	0		214
Ընդամենը	1129	39	16	0	8	6	13	0	4	0		1215

Ընդհանուր առմամբ տեղադրվել, փոխարինվել կամ սահմանազատման կետեր է տեղափոխվել 15-100 մմ տրամաչափի 1215 ջրաչափ: Կատարված աշխատանքների 93%-ը վերաբերել է 15 մմ ջրաչափերին:

1.3. ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ջրահեռացման ցանցում կատարված աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև՝ Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

h/h	Տեղամասի անվանումը	Կոյուղագծերի լվացում մ	Կոյուղագծերում առաջացած խցանումների բացում տեղ	Կոյուղագծերի կառուցում կամ վերակառուցում գծ/մ
1	Արաբկիր	0	247	18
2	Քանաքեռ-Զեյթուն	0	215	0
3	Մաշտոց	120	247	0
4	Շահումյան	0	185	40
5	Շիրակ	0	447	6
6	Արթիկ	0	110	0
7	Ապարան	0	71	0
8	Ալավերդի	1810	34	72
9	Աշոցք	0	7	0
10	Բերդ	300	21	0
11	Իջևան	0	63	10
12	Լոռի	0	248	5
13	Նոյեմբերյան	220	11	0
14	Սպիտակ	0	17	0
15	Ստեփանավան	3645	36	84
16	Թալին	0	38	0
17	Տաշիր	0	7	0
18	Չարենցավան	0	122	0
19	Աբովյան	0	119	12
20	Հրազդան	0	82	156
21	Կենտրոն	380	204	0
22	Հյուսիս	230	254	95
23	Հարավ	100	260	0
24	Էրեբունի	0	138	6
25	Արմավիր	0	142	0
26	Արտաշատ	0	110	0
27	Էջմիածին	0	124	6
28	Աշտարակ	2790	50	0
29	Արարատ	0	94	0
30	Մասիս	0	45	0
31	Գավառ	530	36	72
32	Սևան	580	71	2
33	Մարտունի	0	38	306
34	Վարդենիս	0	6	5
35	Ճամբարակ	0	15	0
36	Դիլիջան	0	69	0
37	Վայք	545	15	0
38	Եղեգնաձոր	0	17	0
39	Զերմուկ	0	51	0
40	Սիսիան	0	34	0
41	Գորիս	0	52	0
42	Կապան	431	102	0
43	Մեղրի	470	37	52
	Ընդամենը	12151	4291	947

1.4. ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՀԵՌԱՑՈՒՄ

Ընթացիկ ամսում «Կեղտաջրերի մաքրման կայանների» ծառայության ենթակայության տակ գտնվող կեղտաջրերի մաքրման կայաններում և պոմպակայաններում կատարվել են բազմաթիվ վթարա-վերականգնողական աշխատանքներ, որոնցից առանձնացվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Գավառի կեղտաջրերի մաքրման կայանում հայտնաբերվեց օդամուղի խափանում: Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ պատճառը շարժիչի այրումն էր: Շարժիչը վերանորոգման նպատակով տեղափոխվեց արտադրամաս: Վերանորոգումից հետո օդամուղը տեղադրվեց իր տեղը և այժմ աշխատում է բնականոն ընթացքով: Կատարվեցին նաև մաքրման կայանում առկա բոլոր ռեդուկտորների և շարժիչների զննում և կարգաբերում:

■ Սևանի N3 կեղտաջրերի պոմպակայանում պոկվել էին պոմպերի տեղադրման և դուրս բերման համար նախատեսված ուղորդիչները, որոնք ամրացվեցին եռակցման միջոցով: Կոտրվել էր նաև խոշոր մասնիկների գտման զամբյուղը, որը ևս վերանորոգվեց: Այժմ պոմպակայանը աշխատում է բնականոն ընթացքով:

■ Գավառի կեղտաջրերի պոմպակայանում պոմպերից մեկը դադարել էր աշխատել: Զննության արդյունքում հայտնաբերվեց, որ էլեկտրական վահանակում տեղադրված եռաֆազ թողարկիչը շարքից դուրս էր եկել: Այն փոխարինվեց նորով: Բացի այդ, հետադարձ փականները մասամբ խցանված էին, որոնք մաքրվեցին և այժմ պոմպակայանը աշխատում է անխափան: Բոլոր ԿՄԿ-ներում և ԿՊ-ներում իրականացվել են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, ստուգվել են բոլոր սարքերը (թե էլեկտրական, թե մեխանիկական), կատարվել են կարգավորումներ:



Աղյուսակ 5. Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

h/h	Գտնվելու վայրը	Կառույցի անվանումը	Մղված կեղտաջրերի ծավալը մ³	Մաքրված կեղտաջրերի ծավալը մ³	Կեղտաջրից առանձնացած կեղտ տ
1	ք. Գավառ	«Գավառ» ԿՄԿ	0	61,968	21.6
2	ք. Մարտունի	«Մարտունի» ԿՄԿ	0	88,528	28.8
3	ք. Վարդենիս	«Վարդենիս» ԿՄԿ	0	171,081	5.4
4	ք. Ջերմուկ	«Ջերմուկ» ԿՄԿ	0	65,085	10.8
5	ք. Դիլիջան	«Դիլիջան» ԿՄԿ	0	0	0
6	ք. Սևան	«Սևանի» N3 պ/կ	19,107	0	0
7	ք. Սևան	«Սևանի» N5 պ/կ	12,974	0	0
8	ք. Գավառ	«Գավառ» պ/կ	14,200	0	0
9	ք. Վարդենիս	«Վարդենիս» պ/կ	10,200	0	0
10	ք. Ջերմուկ	«Ջերմուկ» պ/կ	3,703	0	0

1.5. ԷՆԵՐԳԱՀԱՄԱԿԱՐԳ

Թվով 487 բակային պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում թվով 409 հասցեում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Շարունակվում է բաժանորդների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 01.09.2024 թվականի դրությամբ «Ինտերակտիվ» համակարգ է մուտքագրվել 626,197 պայմանագիր: Հաշվառված բաժանորդների քանակական տվյալները հաշվետու ամսվա դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում:

Տնօրինություն	Սպառողներ	2024թ. օգոստոս ամսին ծառայություններ ստացած բաժանորդների թիվ	Կնքված պայմանագրերի քանակը	%
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	676,545	596,532	88,2
	Իրավաբանական անձ	33,268	30,346	91,2

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 10 մայիսի 2024 թվականի №137-Ն որոշման համաձայն, եթե բաժանորդը մինչև 2024 թվականի հունիսի 20-ը գրավոր չի դիմում «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը լուծելու իր հետ կնքված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը, և նույն ամսաթվից շարունակում է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների փաստացի օգտվելը, այդ պայմանագիրը համարվում է փոփոխված, իսկ այն բաժանորդի դեպքում, ով հանդիսացել է նախկին ջրամատակարար կազմակերպությունների բաժանորդ, սակայն «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ դեռևս չի կնքել համապատասխան պայմանագիր, պայմանագիրը համարվում է կնքված սույն որոշմամբ սահմանված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևին համապատասխան:

Հաշվառված բաժանորդների քանակական տվյալները հաշվետու ամսվա դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում:

Տնօրինություն	Սպառողներ	Բաժանորդների ընդհանուր քանակ	Ծախսող բաժանորդների քանակ	%
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	752,670	607,960	80,8
	Իրավաբանական անձ	38,984	28,836	74,0


Սպառում չունեցող (0-ական ծախսեր) բաժանորդների մասով, հնարավորության դեպքում, լրացուցիչ ստուգայցեր են իրականացվում ինչպես տեղամասերի մասնագետ-տեսուչների, այնպես էլ կենտրոնական գրասենյակի համապատասխան աշխատակիցների կողմից: Միաժամանակ համեմատական վերլուծություններ են կատարվում այլ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների տվյալների հետ: Առևտրային տեղամասերի սպասարկման տարածքում հաշվետու ամսում համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա ձևակերպվել և տվյալների բազա է մուտքագրվել թվով 694 նոր բաժանորդ:

2.2. ՀԱՍՈՒՅԹ


Շարունակվում է ջրաչափերի փոխարինման գործընթացը: Պիլոտային ծրագրերին (Շիրակ, Լոռի, Սևան և այլն) զուգահեռ փոխարինվում են նաև այլ տարածքներում անսարք ջրաչափերը: Նախկին ցածրորակ ջրաչափերը փոխարինվում են նոր՝ բարձրակազ և ավելի զգայուն ջրաչափերով: Խոշոր սպառում ունեցող իրավաբանական բաժանորդների ջրաչափերը հնարավորության դեպքում փացվում են Լոկատոր համակարգին՝ ծախսերը պարբերաբար, առանց այցելության, առցանց հսկելու նպատակով: Իրավաբանական անձերի ջրաչափերը փոխարինվում և տեղափոխվում են բաժանորդների տարածքներից դուրս գտնվող հատուկ դիտահորեր, որը նվազեցնում կամ գրեթե բացառում է ապօրինությունների հնարավորությունը: Գրեթե ամբողջովին փոխարինվել և բաժանորդների տարածքներից դուրս են տեղափոխվել գործող բուժ. հաստատությունների, զին. մասերի, դպրոցների և մանկապարտեզների ջրաչափերը: Փոխարինված ջրաչափերն ուղարկվում են պարտադիր լաբորատոր ստուգաչափման: Օգոստոս ամսվա ընթացքում ստուգաչափվել է 3934 ջրաչափ:

Տնօրինություն	Սպառողներ	Սարքին	Անսարք	Միջամտած	Ստուգաչափված ջրաչափերի քանակ առ 08.2024
Առևտրային	Բնակիչ-բաժանորդ	2125	1250	434	3809
	Իրավաբանական անձ	63	50	12	125
	Ընդամենը	2188	1300	446	3934

Փոխարինված ջրաչափերի լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա ջրաչափերի որոշ մասն ունի խնդիրներ: Օրինակ՝ օգոստոս ամսին փոխարինված 3934 ջրաչափերի մոտ 44 %-ը (կամ 1746 ջրաչափ) անսարք է կամ առկա է արտաքին միջամտություն: Միջամտած ջրաչափերի մասով կազմվում են համապատասխան արձանագրություններ: Ընթացիկ ամսում լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքում, անսարք և միջամտած ջրաչափերից կազմված արձանագրությունների հիման վրա վերահաշվարկվել է 223,049 մ³ հասույթ: Ստորև՝ գրաֆիկական տեսքով, բերված են 2024թ. բաժանորդների ամսական սպառման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ.

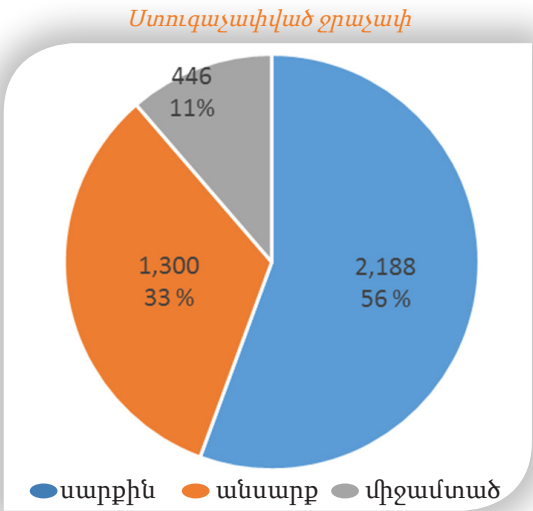

Հասույթ

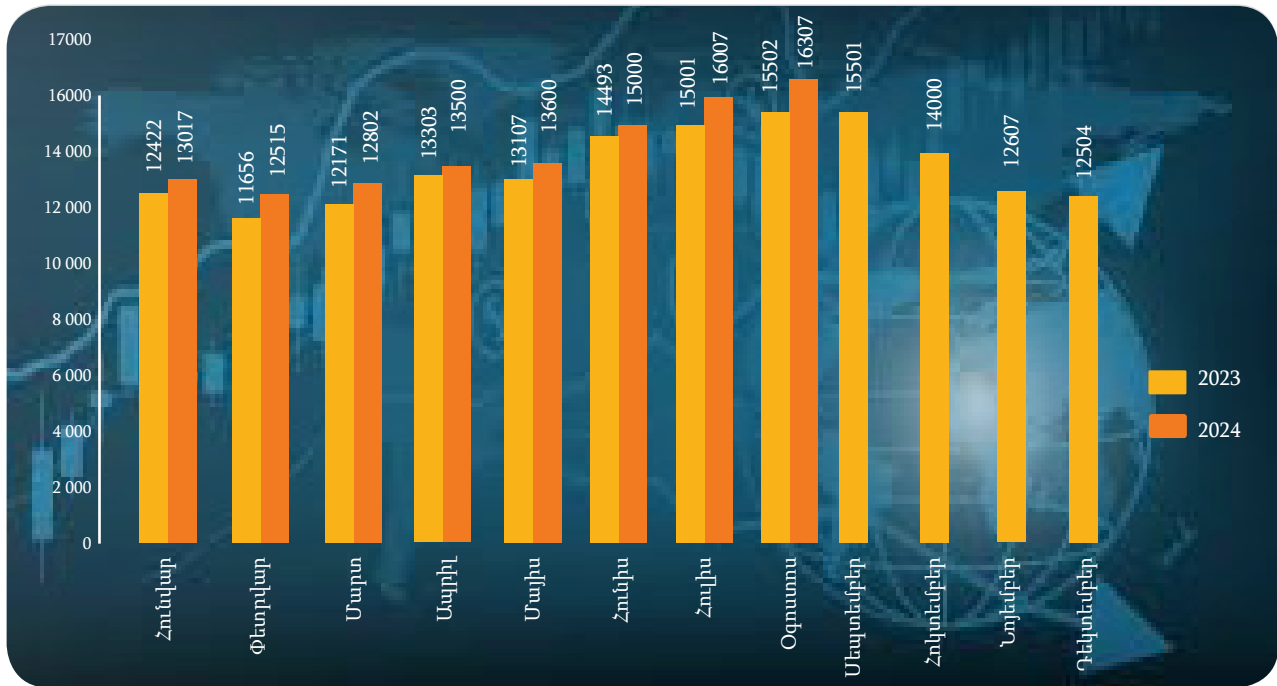

2.3 ԳԱՆՁՈՒՄ

Օգոստոս ամսին նախորդ ամսվա ձևավորված հասույթի համեմատ գանձումը կազմել է 2,890 մլն. դրամ (95 %): Նախորդ ամսվա ձևավորված հասույթի դիմաց վճարումները սահմանված ժամկետում ապահովելու նպատակով ընկերությունում կիրառվում են բաժանորդներին ուղարկվող հիշեցումների և ծանուցումների մի շարք մեթոդներ՝ էլեկտրոնային հաղորդագրություն, գրավոր՝ փոստային առաքում, ծանուցումներ, հեռախոսազանգեր և այլն: Պարբերաբար չվճարող բաժանորդներին «վճարման դաշտ» բերելու նպատակով՝ հնարավորության դեպքում իրականացվում են պայմանագրով և գործող կարգով նախատեսված անհատական ջրամատակարարման դադարեցումներ՝ մինչև պարտքի մարումը կամ պարտքի մարման ժամանակացույցի կնքումը, սակայն, հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում, հաշվետու ամսվա ընթացքում մեր կողմից չեն իրականացվել նաև պայմանագրով և գործող կարգով նախատեսված անհատական ջրամատակարարման դադարեցումներ: Այս իրավիճակը, բնականաբար, իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել գանձման բարձր, նախատեսված ցուցանիշների ապահովման գործում:

2.4 ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ / ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ/

Համեմատաբար մեծ դեբիտորական պարտքերի գանձման նպատակով Առևտրային տնօրինության աշխատակիցների կողմից շարունակվում է պարտքերի մարման ժամանակացույցերի կնքման գործընթացը: Օգոստոս ամսվա ընթացքում Առևտրային տնօրինության կողմից կնքվել է թվով 185 պարտքի մարման ժամանակացույց՝ մոտ 22.6 մլն դրամ ընդհանուր գումարով: Ժամկետանց խոշոր դեբիտորական պարտք ունեցող բաժանորդների պարտքերի գանձմանն իրավական ընթացք տալու համար, առաջնահերթ նոր պայմանագրեր են կնքվում այդ բաժանորդների հետ, ճշգրտվում են դեբիտորական պարտքերի չափը, և պարտատերերի ցուցակները ներկայացվում են իրավաբանական վարչություն:

Ստորև աղյուսակով ներկայացվում է դեբիտորական պարտքերի և հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ արձանագրություններով դատարան ներկայացված գործերը:

Դատարան ներկայացված գործերի քանակը շարունակական		Բավարարված		Մերժված		2017-2024թթ. ընթացիկ ործեր		ԴԱՀԿ ներկայացված գործեր	
քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար	քանակ	գումար
32,799	4,530,813,896	20,254	2,392,317,052	1,114	274,483,180	12,545	2,138,496,844	12,431	1,490,371,704

Ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակը՝ դատարան ներկայացրած գործերի ընդհանուր քանակի 62 %-ն արդեն բավարարված է և ընդամենը 3 %-ը մերժված:


Դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ տվյալները բերված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

Տնօրինություն	Պարտքը 01.09.2024թ. դրությամբ (մլնԼՀ դրամ)	Այդ թվում օգոստոս ամսվա հասույթ (մլն. ՀՀ դրամ)
Առևտրային, այդ թվում	12,181	3,085
Բնակիչ-բաժանորդներ	8,514	2,068
Իրավաբանական անձեր	3,667	1,017

Հարկ է նշել, որ մարզերի տարածաշրջանի բաժանորդների առկա պարտքերը դեռ հստակեցված չեն և առայժմ հանված չեն այլ ընկերություններ փոխանցված վճարումները, ինչպես նաև հաշվի չեն առնված բաժանորդների՝ նախկինում ունեցած կանխավճարները: Նշված հանգամանքը բավականին դժվարեցնում է բաժանորդների հետ դեբիտորական պարտքերի ճշգրտման ու գումարների հավաքագրման գործընթացը, ինչպես նաև դատական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը:

Շուրջ 439.6 մլն. ՀՀ դրամը կուտակվել է երկու բաժանորդներին մատուցված ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց մեծածախ սակագնով պարբերաբար չվճարելու պատճառով: Դրանք են՝ «Հաճն Զուր» ՀՈԱԿ-ը և «ՀՀ Արարատի մարզի Ագատաշեն» համայնքը:

2024 թ.դեբիտորական պարտքերի շարժը / մլն.դրամ (Մարզեր)

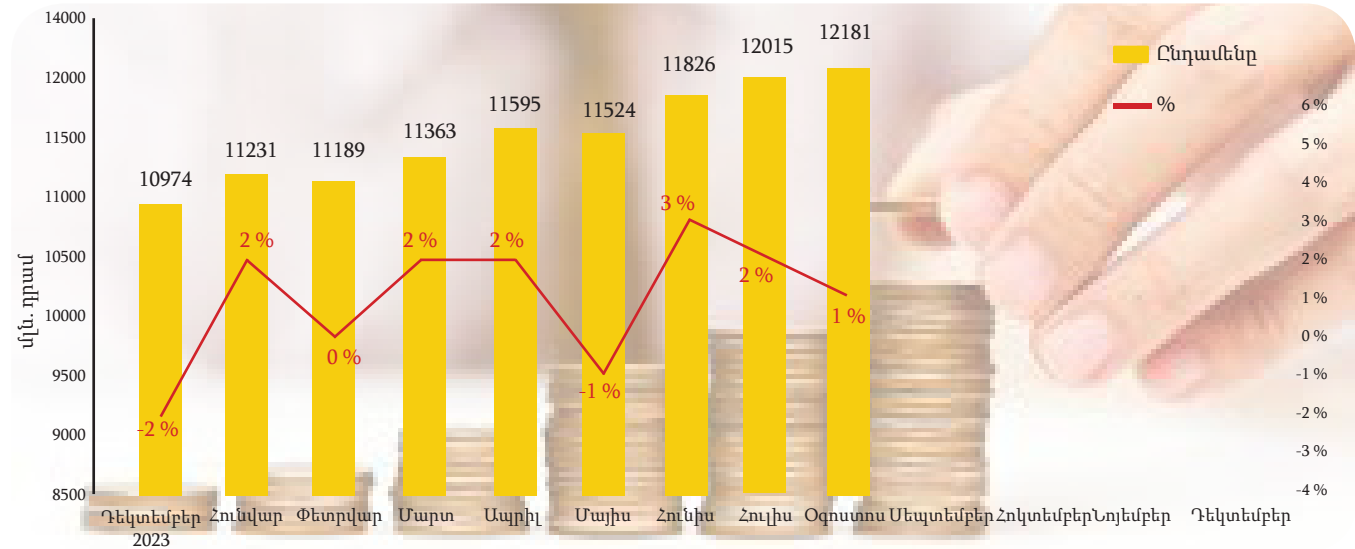

2.5 ԶՐԱՀԱՓԵՐ

Բաժանորդների տվյալների բազայում 01.09.2024թ. դրությամբ հաշվառված ջրաչափով և առանց ջրաչափի (նորմատիվային եղանակով հաշվարկվող) բաժանորդների քանակական տվյալները բերված են ստորև աղյուսակում.

Տնօրինություն	Սպառողներ	Բնակիչ-բաժանորդներ			Իրավաբանական		
		Հնդամենը	Այդ թվում ծախսող	%	Հնդամենը	Այդ թվում ծախսող	%
Առևտրային	Ջրաչափով	724,029	606,889	83.82	37,963	28,814	75.90
	Առանց ջրաչափի	28,641	1,071	3.74	1,021	22	2.15

Տվյալների բազայում 01.09.2024թ. դրությամբ պիտանելիության ժամկետը (12 տարին) գերազանցող ջրաչափերի քանակական տվյալները ներկայացված են աղյուսակային տեսքով.

Տնօրինություն	Բնակիչ-բաժանորդներ			Իրավաբանական		
	Գործող ջրաչափերի քանակը	Այդ թվում՝ ժամկետանց	%	Գործող ջրաչափերի քանակը	Այդ թվում՝ ժամկետանց	%
Առևտրային	895,087	375,088	41.91	41,19	6,546	15.89

Առաջնահերթությամբ՝ խափանված, հետո պիտանելիության ժամկետը գերազանցող ջրաչափերի տվյալները ներկայացվում են համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ դրանց փոխարինման նպատակով:

Հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղադրվել և փոխարինվել է (այդ թվում՝ թաղամասային ծրագրով) 5715 ջրաչափական սարք: Այդ թվում՝ նախկինում ջրաչափական սարք չունեցող բաժանորդների մոտ տեղադրվել է 996 նոր ջրաչափ և այդ բաժանորդներին մատուցված ծառայությունների հաշվարկն այսուհետ կատարվում է նոր տեղադրված ջրաչափերի ցուցմունքների հիման վրա:

Երևանի թաղամասային ծրագրի շրջանակներում կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են գոյություն ունեցող ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ ավելի բարձր դասի ջրաչափերով, ինչն էլ նպաստում է բաժանորդների միջին ծախսի ճշգրիտ հաշվառմանը:

ՊԿԱԾ տեղադրված ջրաչափեր

Հասցե	Ջրաչափերի ընդհանուր քանակ	Տեղադրված ջրաչափերի քանակ	%
գ.Քասախ	2498	2059	81.9
գ.Պռոշյան	1735	1142	66.5
ք.Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ.	6045	1978	32.4

Տեղամասերում ընկերության տնօրինությունների ուժերով իրականացվում է բաժանորդների ջրաչափերի փոխարինման թաղամասային ծրագիր:

Ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել մի շարք տեղամասերի սպասարկման տարածքներում: Առկա անսարք և փոխարինման ենթակա ջրաչափերից արդեն փոխարինվել է Լոռի տեղամասի սպասարկման տարածքի տարբեր հասցեներում՝ 21863, Շիրակ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 19340, Գորիս տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5159, Կապան տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5890, Սիսիան տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 2956, Արարատ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 5355 և Արտաշատ տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 8815 ջրաչափական սարք:

2.6 ԱՊՕՐԻՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՑՈՒՄ

Առևտրային տնօրինության տեղամասերի աշխատակիցների ամենօրյա աշխատանքի մաս են կազմում ապօրինի միացումների հայտնաբերման, արձանագրման և ապօրինությունների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները: Կազմված արձանագրություններն «Ինտերակտիվ» համակարգ մուտքագրելուց հետո, ապօրինություն կատարած անձիք սահմանված կարգով ծանուցվում են, նրանց են ներկայացվում վերահաշվարկվող, վճարման ենթակա գումարների չափերը, իսկ տվյալ հասցեները փոխանցվում են տարածաշրջանի շահագործման տնօրինությանը՝ ջրագրվում իրականացնելու նպատակով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերված ապօրինի միացումների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների հիման վրա վերահաշվարկված ջրածախսերի տեղեկատվությունը բերված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Տնօրինություն	Քանակ	Խ.մ.	Գումար (ՀՀ դրամ)
Առևտրային	393	172,486	31,929,734

Ապօրինությունների հայտնաբերման և արձանագրությունների կազմման գործառնությունը, տեղամասերի առևտրային ծառայության աշխատակիցներից բացի, իրականացվում է նաև Գլխավոր տնօրինության առևտրային վերահսկողության աշխատակիցների կողմից:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորև ներկայացված գրաֆիկում պատկերված են Երևան քաղաքի օգոստոս ամսվա շարունակականության տվյալները, որը կազմում է 94.8%, ինչը 1.3%-ով ցածր է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշների համեմատ:


Շարունակում է գործել ընկերության կողմից սպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման գրաֆիկը, որը համաձայնեցվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ:



Ջրամատակարարման շարունակականություն Երևան

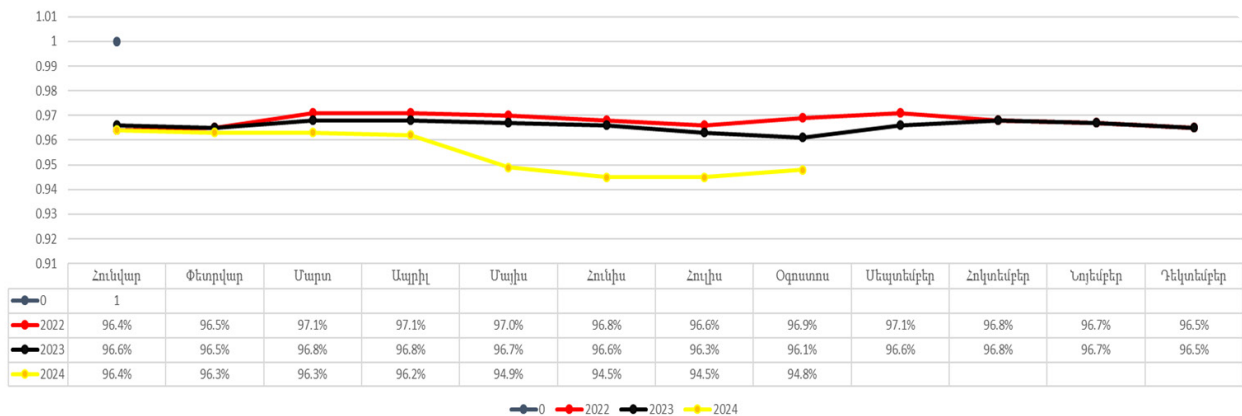


Հաշվետու ամսվա ընթացքում «Շարունակականության և մոնիթորինգի բաժնի» կողմից ՇՏ-ներում կարգաբերվել են թվով 45 ՃԿՓ-ներ:

Ստորև ներկայացված է կարգաբերված ՃԿՓ-ների գրաֆիկներից մի քանիսը՝






Երևան քաղաքը սնող Գառնի, Ապարան, Արզնի 1, Արզական, Գյումուշ 1,2 և Կաթնաղբյուրի ջրատարների ինքնահոս ջրաքանակը 2024թ-ի օգոստոս ամսին 2023թ-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 89լ/վ-ով, իսկ Երևան քաղաքի ջրարտադրության համար էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 412 հազար կՎտ-ով, ինչը երևում է ստորև ներկայացված գրաֆիկում:

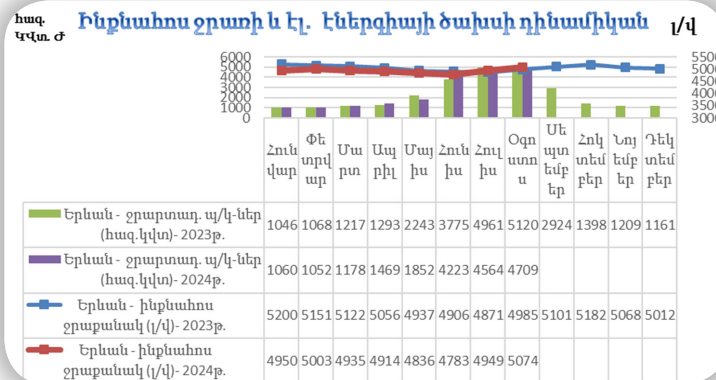

3.2. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաշվետու ամսվա ընթացքում էլ. էներգիայի ծախսը Երևան քաղաքում նվազել է 6018 կՎտ/ժ (0,50%), այն դեպքում երբ նորակառույց շենքերի 20 պոմպակայան ավելացել է «Վեռլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ: Այդ 20 պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսը միայն կազմում է 9728 կՎտ/ժ, իսկ առանց այդ պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսը կնվազեր 15746 կՎտ/ժ:

Երևան քաղաքի բակային պոմպեր (առանց Խարբերդի պոմպակայանի)

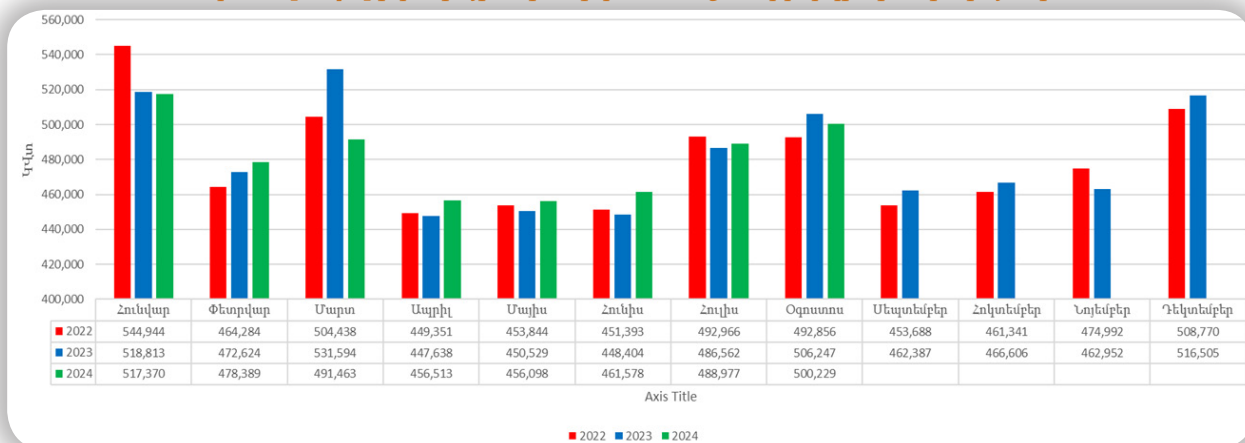

Երևան քաղաքի բակային պոմպեր

Հաշվետու ժամանակահատվածում գույքագրվել են 138 էլ. հաշվիչներ: Ձևավել է 2 նոր ընդունվող պոմպակայան, «Հացառատ», «Չովունի» և «Բաղրամյան խ/հ» պոմպակայաններում փոխարինվել են ներքին հաշվառման էլ. հաշվիչները: Տեղադրվել է Բաբաջանյան 3/1 հասցեի հոսքաչափի էլ. հաշվիչը: Ամենօրյա կարգով ընթերցվել և հաշվետվություն է ներկայացվել ջրարտադրության խոշոր պոմպակայանների էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ, «Հեց» ՓԲ ընկերության կողմից տրամադրված փոխադարձ ակտերի ծախսերի մուտքագրում, մշակում և վերլուծություն:

Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ԿՈՒՊ (կարգավորվող ուղիղ բաղադրիչում) և ՕԱՇ (օր առաջ շուկա) բաղադրիչներում կատարվել է առևտրային գործընթաց, որի արդյունքում տնտեսվել է համապատասխանաբար 9,880,961 ՀՀ դրամ (առանձ ԱԱՀ) և 708,492 ՀՀ դրամ (առանձ ԱԱՀ): Կատարվել է էլ.էներգիայի հաշվառում, գործարքների արդյունքում ձևավորված ակտերի ստուգում, հաստատում:

Պոմպակայանների ուսումնասիրություն

Թվով 42 խոշոր պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում 31 պոմպակայանում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:

Թվով 487 բակային պոմպակայանում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում թվով 409 հասցեում վերացվել են հայտնաբերված թերությունները:


Ինվերտորների տեղադրում

- Հաշվետու ամսում վեց հասցեում տեղադրվել է ինվերտորային համակարգ.
- Իսրաելյան 37 (Ke-18)
- Նուռնուս ամառանոցների (Byu-6)
- Գոլովինտ ՋՄԿ (Dil-2)
- Հակոբյան 1 (Ar-145)
- ք. Մեծամոր, 2-րդ թաղ. Յբ. (N.Ak-25)
- Արշակունյաց 44/3-46/2 (She-101)

Ինվերտորային պոմպի տեղադրում

- Հաշվետու ամսում մեկ հասցեում տեղադրվել է ինվերտորային պոմպ.
- Բազրատունյաց 17 (She-77)

Տեղադրված ընդհանուր 164 ինվերտորային համակարգով պոմպերի սպառած էլ. էներգիան, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է -164,170 կՎտ/ժ-ով 21%-ով:

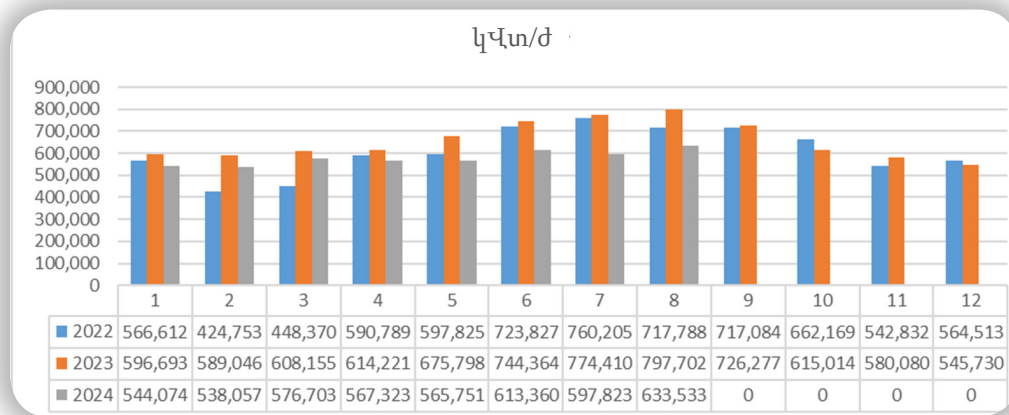


Խոշոր պոմպակայանների էլեկտրաէներգիայի խափանումներ

■ Հաշվետու ժամանակահատվածում 27 խոշոր պոմպակայաններում էլ. մատակարարման խափանումներն օպերատիվ կերպով շտկվել են, իսկ առաջացած թերությունները՝ հայտնաբերվել և վերացվել:

Երևան քաղաքի՝ «Վեուլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլեկտրաէներգիան


■ 2024թ. օգոստոս ամսին Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայաններում էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 499800 կՎտ/ժամ (9,29%)՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլեկտրաէներգիա

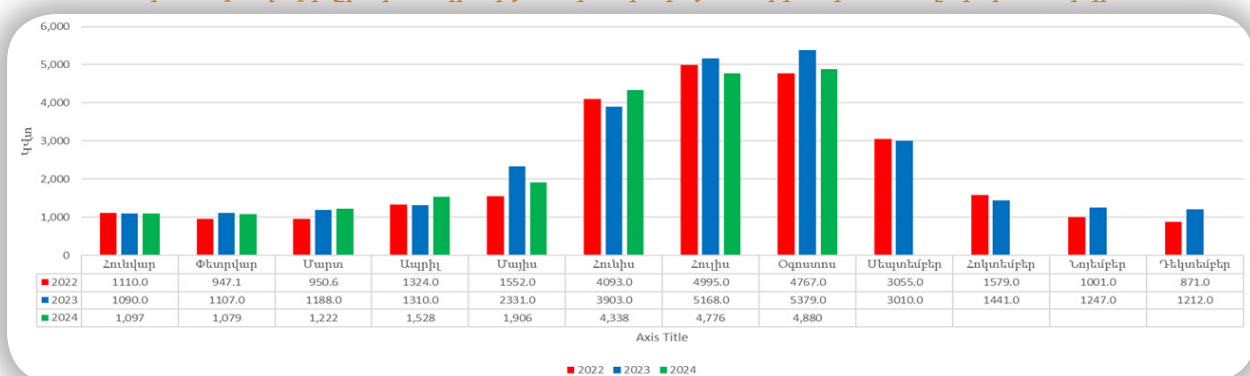

■ Ջրարտադրության պոմպակայաններում (մարզեր) էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 402 281 ԿՎտ/ժ/ամիս կամ 12,71 %՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Մարզերի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլեկտրաէներգիա

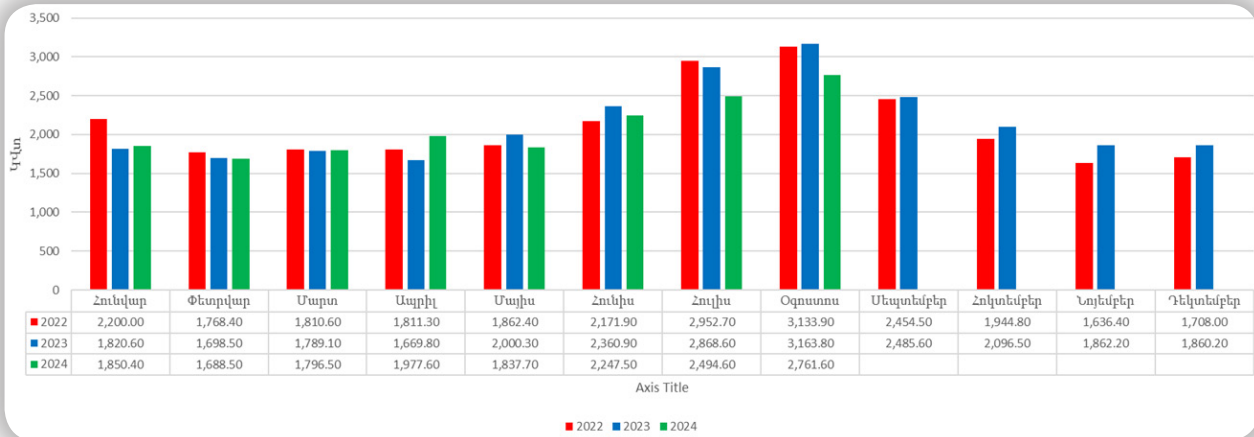

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլ. էներգիան

■ Ընդհանուր էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 1173319 ԿՎտ/ժամ 11,58%՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլեկտրաէներգիան




«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպառած էլ.էներգիան (ներառյալ արևային կայանների արտադրանքը)

կՎտ

Վեոլիա Ջուր

15,000,000
10,000,000
5,000,000
-



3.3. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ստորև աղյուսակում ներկայացվում են հունիս ամսվա ընթացքում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգում կատարված աշխատանքները.

Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ
Կատարողական նախագծերի հիման վրա կատարվել է Գյումրի քաղաքի և Նոր Խարբերդ գյուղի ջրագծերի թվայնացում, թարմացում և ուղղում	քաղաք	2
Շիրակի մարզի 26 գյուղերի ջրագծերի հիդրավիկ մոդելների կազմում	գյուղ	26
Տեխնիկական պայմանների դիմումների վերաբերյալ դիմորդի տարածքի տեղադիրքի թվայնացում, կազմվում է քարտեզ՝ տարածքում առկա կոմունիկացիաներով, որը մուտքագրվում է փաստաթղթաշրջանառություն: Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է 206 գործի թվայնացում՝ 332 բաժանորդ	բաժանորդ	332
«ԱՏՀ»-ում առկա Երևան քաղաքի ջրագծերի և ջրատարների երկարությունը կազմում է 2880 կմ	կմ	2880
«ԱՏՀ»-ում առկա մարզային ջրագծերի և ջրատարների երկարությունը կազմում է 9732 կմ	կմ	9732
«ԱՏՀ»-ում առկա Երևան քաղաքի ընդհանուր կոյուղու երկարությունը կազմում է 1870 կմ	կմ	1870
«Բնտերակտիվ» համակարգում ֆիզիկական նոր կետերի ավելացում	կետ	265
«Բնտերակտիվ» համակարգում իրավաբանական նոր կետերի ավելացում	կետ	345
«Բնտերակտիվ» համակարգում ֆիզիկական բաժանորդ կետերի ուղղում	կետ	600
«Բնտերակտիվ» համակարգում իրավաբանական բաժանորդ կետերի ուղղում	կետ	490
196 տեխնիկական պայմանների թվայնացում / 307 բաժանորդ/	Տեխ. պայման	196

3.4. ԶՐԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Գառնի-Երևան Գառնի պոմպակայանում տնական ժամանակ կապտածներից եկող ջրաքանակը լցվում էր գետը: Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ պոմպերն աշխատում էին՝ դրենաժային հզորություններից ցածր արտադրողականությամբ: Կատարվեցին կարգավորումներ, որոնց արդյունքում Գառնի-Երևան ջրատարում ջրաքանակն ավելացավ 100լ/վ-ով:

Գառնի-Արտաշատ ջրատարի շրջայցի ընթացքում հայտնաբերվեց վթար՝ 10լ/վ մեծությամբ: Վթարը վերացվեց «Արտաշատ» ՇՏ-ի կողմից:



■ Ոսկեթափ համակարգում իրականացրած ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվեց, որ գոյություն ունեցող ջրաքանակն ամբողջությամբ չէր հասնում համակարգից օգտվող բաժանորդներին, պատճառը՝ ջրատարի վրա գտնվող 2 հատ մարիչ հորերի ելքերի փոքր տրամագծի խողովակներն էին, որոնք ստեղծում էին տեղային դիմադրություն և ջուրն արտահոսում էր մարիչ հորից: Կազմակերպված կանգառների ընթացքում փոխարինվեցին $d=100$ մմ-անոց խողովակները $d=150$ և $d=200$ մմ խողովակներով, որի արդյունքում

Պարտիզակ, Նոր Ամանոս և Արուճ մեծածախ գյուղերին տրվող ջրաքանակն ավելացավ 5լ/վ-ով:

■ Գառնի պ/կ տեղադրվեց նաև $d=200$ մմ հետադարձ փական՝ N4, N5 և N6 պոմպերի մուտքերի միջանկյալ միացման վրա, որի արդյունքում N4 և N5 պոմպերի կանգառի դեպքում ավելացած ջրաքանակն արտահոսում էր N6 (ավելի ցածր գտնվող) պոմպի սնուցման կապտածով:



■ Ջերմանիս-Վեդի ջրաղբյուրների ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ «Այգեվան» սարատեղիում գտնվող աղբյուրներում առկա է մոտ 4լ/վ ջրաքանակ: Կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ թրթուրավոր շարժասարքով, այդ ջրաքանակն ուղղելու Վեդի քաղաք:



Հաշվետու ամսում կատարվել են նաև ջրաքանակների չափումներ և կարգավորումներ:


3.5 ՔԼՈՐԻ ԵՎ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ընթացիկ ամսում «Ջրառ» ծառայության կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

■ Քաղաք Աշտարակ, Բազմադրյուր, քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով՝ հեղուկ քլորի համակարգի խափանված վակուում կարգավորիչը փոխարինվել է վերանորոգված վակուում կարգավորիչով:



■ Քաղաք Եղեգնաձոր, Գետափ քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով 16.08.2024թ. վերանորոգվել են հեղուկ քլորի համակարգի հում ջրի և քլորաջրի շարքից դուրս եկած գծերը:



■ Քաղաք Երևան, Ավան-Առինջ տեղամասում նորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի պահեստային վակուում կարգավորիչը:



■ Քաղաք Եղեգնաձոր, Գետափ քլորակայանում հեղուկ քլորի համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով 31.08.2024թ. նորոգվել է հեղուկ քլորի համակարգի քլորագիծը:

■ «Ապարան-Երևան» ջրատարի վրա իրականացվել են՝ թուջե փականի վերանորոգման աշխատանքներ:



■ Վերացվել է «Մաքրավան-Աբովյան» D=700մմ-ոց ջրատարի վթարը:

■ Մաքրավան պոմպակայանում փոխվել է «Մաքրավան-Հրազդան» ջրատարի 200մմ-ոց փականը:



■ Կաթնադրյուր քլորակայանում սանհանգույցի կառուցում՝ ծառայության ուժերով:

3.6 1-85 ԹԵԺ ԳԻԾ

185 հեռախոսային կանչերի օրական հաշվառման հաշվեկշիռ

■ Հաշվետու ամսվա ընթացքում 1-85 հեռախոսակենտրոնում գրանցվել է 45715 հեռախոսազանգ:

■ Առևտրային բնույթի զանգերի քանակը կազմել է 13101 զանգ, որից Երևան քաղաքին էղել է 10144 զանգ (77.4%), իսկ մարզերի ցուցանիշը 2957 զանգ (22.6%):

■ Շահագործման բնույթի զանգերի քանակը կազմել է 32614 զանգ, որից Երևան քաղաքին էղել է 21697 զանգ (66.5%), իսկ մարզերին էղել է 10917 զանգ (33.5%):



	Ստորաբաժանում	2023 Օգոստոս	2024 Օգոստոս	2023/2024 Տարբերություն
Առևտրային	Ընդամենը	11496	13101	13.96%
	Երևան	9035	10144	12.27%
	Մարզեր	2461	2957	20.15%
Շահագործում	Շահագործում	40081	32614	-18.63%
	Երևան	29776	21697	-27.13%
	Արաբկիր	5182	4444	-14.24%
	Քանաքեռ-Զեյթուն	2436	1504	-38.26%
	Մաշտոց	4831	4684	-3.04%
	Շահումյան	3545	1864	-47.42%
	Շենգավիթ	3692	2499	-32.31%
	Կենտրոն	4698	2761	-41.23%
	Հյուսիս/Ավան Լոր Լորք/	3741	2156	-42.37%
	Էրեբունի	1651	1785	8.12%
	այդ թվում կոյուղու վթար	168	189	12.50%
	այդ թվում դիտահորի խցանում	3436	3935	14.52%
	ՄԱՐԶԵՐ	10305	10917	5.94%
	Հարավ	5261	5827	10.76%
	Հյուսիս	5044	5090	0.91%
	այդ թվում կոյուղու վթար	58	447	670.69%
	այդ թվում դիտահորի խցանում	2755	2813	2.11%
Ընդամենը		51577	45715	-11.37%

■ 2023թ. օգոստոս ամսվա համեմատ՝ 2024թ. օգոստոս ամսին 13,96%-ով ավելացել է առևտրային զանգերի քանակը, իսկ շահագործման զանգերի քանակը նվազել է 18,63 %-ով:

■ 2023թ. օգոստոսի համեմատ՝ 2024թ. օգոստոս ամսին 23%-ով նվազել է ֆիքսված զանգերի քանակը, 24%-ով նվազել է հայտարարությունների լուսն ավտոմատ ծառայության միջոցով և 8%-ով՝ 5 րոպեից ավել զանգերի քանակը:


Ջրամատակարարման գրաֆիկի բողոքներ

■ 2023թ. օգոստոսի համեմատ՝ 2024թ. օգոստոս ամսին 30,06%-ով նվազել է ջրամատակարարման զանգերի քանակը:

■ 2023թ. օգոստոսի համեմատ՝ 2024թ. օգոստոս ամսին նվազել է հետզանգով սպասարկված զանգերի քանակը 62%-ով: 2023թ. օգոստոս ամսին կատարվել է 77889 հետզանգ, իսկ հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ 29666 հետ զանգ:

ՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Օգոստոս ամսվա գլխավոր և կարևոր իրադարձությունն այն էր, որ Ընկերությունը հայտ ներկայացրեց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ իր կողմից սպասարկվող տարածքում խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման գումարային սակագներն անփոփոխ թողնելու համար: 296-Ն որոշման համաձայն՝ հայտարարությունը հրապարակվեց «Առավոտ» և «Իրավունք» թերթերի պաշտոնական aravot.am և iravunk.com կայքէջերում, ինչպես նաև հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական azdarar.am կայքէջում:

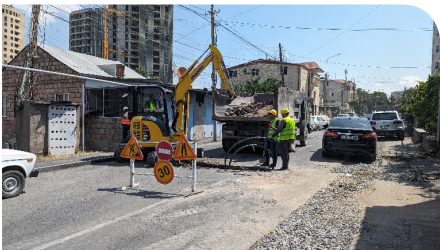


Հաշվետու ամիսը շարունակվեց լարված մալ Վեոլիաթիմի համար, հատկապես, որ ողջ ամսվա ընթացքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում վթարների պակաս չգրգվեց:

Ամսվա սկզբում մեծ խնդիր առաջացավ Արարատի մարզում, որտեղ 7 օրում 9 անգամ վթարվեց «Զոդ-Սուրենավան-Արմաշ-Երասխ» 16 կմ-ոց ջրատարը: Քանի որ այդ հատվածում վթար վերացնել այլևս հնարավոր չէ, Վեոլիաթիմը ձեռնարկեց 2 օրում վերակառուցել վթարային՝ 800 գծամետր հատվածը: Սակայն այդ օրերին, երբ ստիպված դադարեցված էր ջրամատակարարումը, Ընկերությունը ջրատար մեքենաներով ապահովել է սպառողներին բավարար ջրաքանակով: Ընդ որում, այս ինֆորմացիան

դրական իմաստով լայնորեն լուսաբանվել է մամուլում: Իսկ այդ ամբողջ ընթացքում Հանրային կապերի ծառայությունը պարբերաբար ֆեյսբուքյան էջի միջոցով անդրադարձել է ջրատարի նորոգման աշխատանքներին, ինչպես նաև Ֆրի նյուզ հեռուստաալիքի հետ կազմակերպել աշխատանքների ընթացքը լուսաբանող ռեպորտաժ: Պահպանվել է ակտիվ կապ տարբեր լրատվամիջոցների հետ, տրամադրվել են անհրաժեշտ նկարներ և ինֆորմացիա՝ խնդրի օբյեկտիվ լուսաբանման համար:

Հաջորդ մեծ աղմուկը սկսվեց, երբ Հրազդանի կիրճում վթարվեց Քանաքեռ-Զեյթուն, Արաբկիր վարչական շրջանների կոյուղու 1000 մմ-ոց մետաղական կոլեկտորը: Տասնյակ լրատվամիջոցների զանգերին ի պատասխան տրվել է հստակ ինֆորմացիա վթարի վայրի, պատճառի և վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ: Իսկ Առաջին ալիքի (Հ1) հետ, վթարի վայրից կազմակերպվեց այդ աշխատանքների մասին պատմող ռեպորտաժ:

Ամսվա 3-րդ խոշոր վթարը Աշտարակի խճուղում միաժամանակ Աջափնյակ վարչական շրջանը սնող 2 ջրատարների վթարն էր: Հանրային կապերի ծառայությունը անմիջապես ֆեյսբուքյան էջում, գրեց վթարի վայրի և վթարավերացման աշխատանքների բարդության մասին՝ մատնանշելով բարդ տեղանքն ու տարածքում շինարարական բազայի առկայությունը: Հանրային կապերի ծառայությունը ձեռքը պահելով թեմայի զարկերակին՝ պարբերաբար ընկերության ֆեյսբուքյան էջի, ինչպես նաև լրագրողների հետ շփումների միջոցով տեղեկացրել է ընթացող աշխատանքների մասին: Մյուս կողմից էլ շատ լավ հասկանալով, որ ստեղծված իրավիճակը սպառողներին կենցաղային անհարմարություններ է պատճառել, պարզաբանվել է, որ Վեոլիաթիմն այդ օրերին ոչ մի վայրկյան չի հեռացել շինհրապարակից: Պարզապես շատ հաճախ, կախված

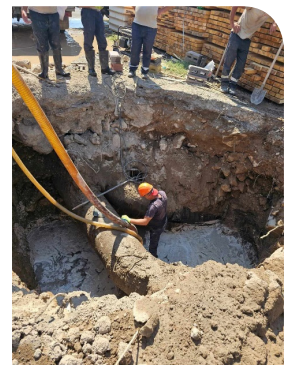

վթարի տեղից, բարդությունից, ընթացքում առաջացած անկանխատեսելի խնդիրներից, վթարավերացման աշխատանքները երկար են տևում: Վստահեցրել ենք, որ որևէ հասցե կամ խնդիր ընկերության ուշադրությունից երբևէ դուրս չի մնում: Ի վերջո, 2 օր տևած աշխատանքներից հետո Աջափնյակի ջրամատակարարումը վերականգնվեց:



Իսկ ընդհանուր առմամբ, օգոստոսին համակարգում շարունակվել են ակտիվ ջրաշինարարական աշխատանքները: «Ֆրի նյուզ» հեռուստաալիքի հետ լուսաբանվել է Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով Սարի Թաղում և Արաբկիրում ընթացող ջրագծերի կառուցման աշխատանքները: Դրանց մասին պատմող նյութերը լուսանկարներով տեղադրվել են նաև ընկերության ֆեյսբուքյան և պաշտոնական կայքէջերում:



Դրանից բացի այս ամիս նոր համագործակցություն սկսվեց «Կենտրոն» և «Թիվ 5» հեռուստաալիքների հետ, որտեղ ցուցադրվեցին Երևանում ընթացող ջրաշինարարական աշխատանքների մասին ռեպորտաժները:

Ամսվա ուրախալի լուրերից էր Ընկերության ավտոպարկի համալրումը 7 ինքնաթափ բեռնատարներով: Լուսանկարներով հրապարակվեց նյութ այն մասին, որ ընկերությունը ձեռք է բերել «Howo Sinotruk» մակնիշի բեռնատարներ՝ նախատեսված հողային և շինարարական աշխատանքների համար:

Օգոստոսին շատ էին հրապարակումները ապօրինությունների հայտնաբերման և ջրագողության դեպքերի մասին Պարբերաբար խոսվել է այն մասին, որ ամռան այս շոգ օրերին, երբ ՎեոլիաԹիմը «քամում» է ջրաղբյուրները սպառողներին կանոնավոր ջրամատակարարում ապահովելու համար, ամբողջ համակարգը գերլարված աշխատում է, դարձյալ կան մարդիկ, որոնք շարունակում ենք զբաղվել ջրագողությամբ: Մեր մասնագետների կատարած շրջայցերի ընթացքում հանրապետության տարբեր բնակավայրերում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ապօրինի և անհայտ միացումներ: Հայտնաբերված բոլոր ապօրինի ջրագծերը խցափակվել են, իսկ տնտեսված ջուրն ուղղվել է բաշխիչ ցանց:

Լայնորեն լուսաբանվել է ջուրը խնայելու մյուս տարբերակը, երբ հայտնաբերվում են գաղտնի վթարներն ու վերացվում դրանք: Միայն «Մաշտոց» շահագործման տեղամասի մի քանի օրվա աշխատանքի արդյունքում բաշխիչ ցանց է վերադարձվել վայրկյանում 22 լիտր ջուր: «Գավառ» շահագործման տեղամասի և Գոտիավորման խմբի մասնագետների իրականացրած աշխատանքների արդյունքում «Հացառատ-Լճաշեն» ջրատարի վրա տնտեսվել է վայրկյանում 20 լիտր ջուր: Այսպիսի հրապարակումների միջոցով ցույց է տրվում, թե ինչպես է Ընկերությունը լիտր առ լիտր պայքարում կորուստները հայտնաբերելու և խնայված ջուրը բաշխիչ ցանց վերադարձնելու համար:

Լուսաբանվել են Դիլիջան, Ծաղկաձոր, Էջմիածին, Վարդենիս և այլ բնակավայրերում ջրագծերի, ինչպես նաև՝ Մեղրի, Ագարակ քաղաքներում կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքները:

Շատ են եղել հրապարակումներ ընկերության կարիքների համար պահանջվող ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարման, թափուր հաստիքների, ինչպես նաև վթարային ու պլանային ջրանջատումների մասին հաղորդագրությունները:



ՈՐԱԿԻ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

5.1. ԴԱՍԸՆԹԱՅՆԵՐ/ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

■ ՈԱԱ Բաժինը, հիմք ընդունելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 21/04/2011 թվականի N 529-Ն որոշմամբ սահմանված «Քլորի արտադրության, օգտագործման, պահման և փոխադրման ժամանակ անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի» պահանջները, ինչպես նաև Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում» բարձր ռիսկերի կառավարման ստանդարտի և «Կյանքը փրկող կանոններ»-ի (LRS) պահանջները Ընկերության Տեխնիկական տնօրինության թվով 35 աշխատողի համար կազմակերպեց և իրականացրեց ստորև ներկայացվող 4 մոդուլից բաղկացած առկա դասընթացները և գիտելիքների ստուգումը

■ «Քլորակայաններ շահագործող, սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական որակավորման դասընթաց» և գիտելիքների ստուգում,


■ «Առաջին օգնություն ցուցաբերելու եղանակները» թեմայով դասընթաց,

■ Վեոլիա Գրուպի «Աշխատանքներ փակ տարածքում/նոր խմբագրություն» ԲՌԿ ստանդարտի պահանջները թեմայով դասընթաց,


■ Վեոլիա Գրուպի «Կյանքը փրկող կանոնները» թեմայով դասընթաց:



2023-2024թթ. կազմակերպված դասընթացներին/հրահանգավորումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակների համեմատական գրաֆիկ

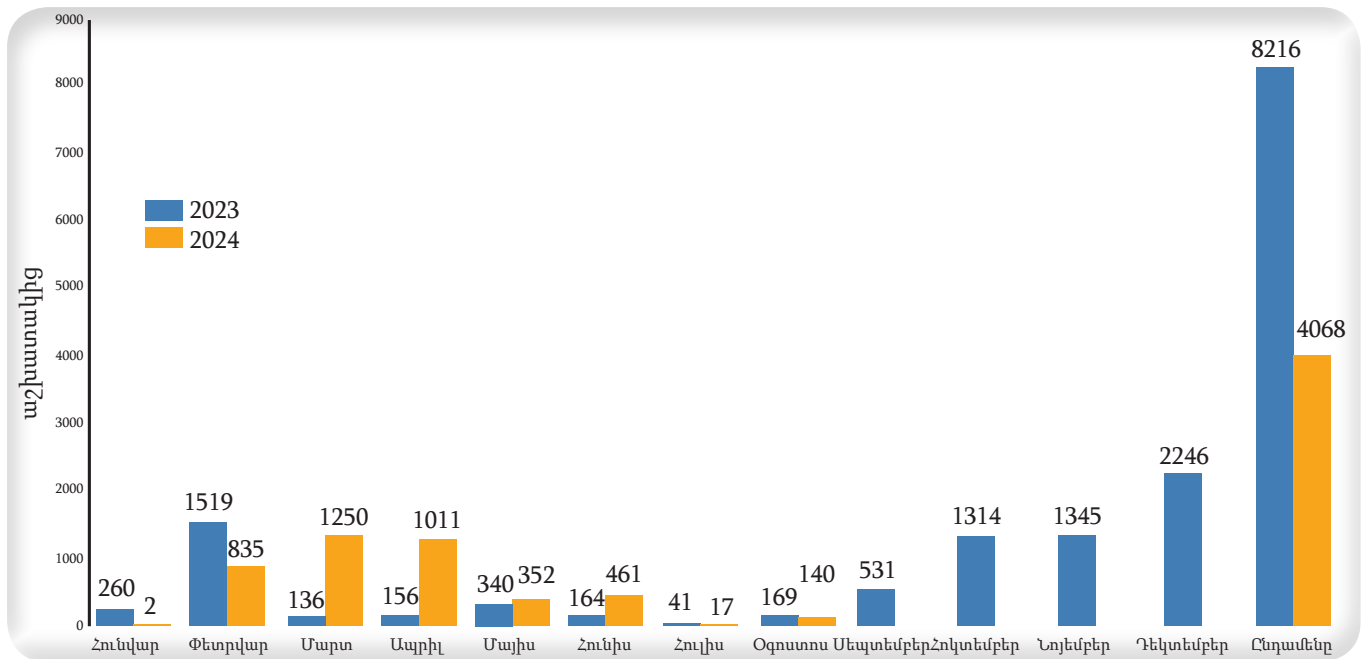

2023-2024թթ. կազմակերպված դասընթացներին/հրահանգավորումներին ժամային համեմատական գրաֆիկ

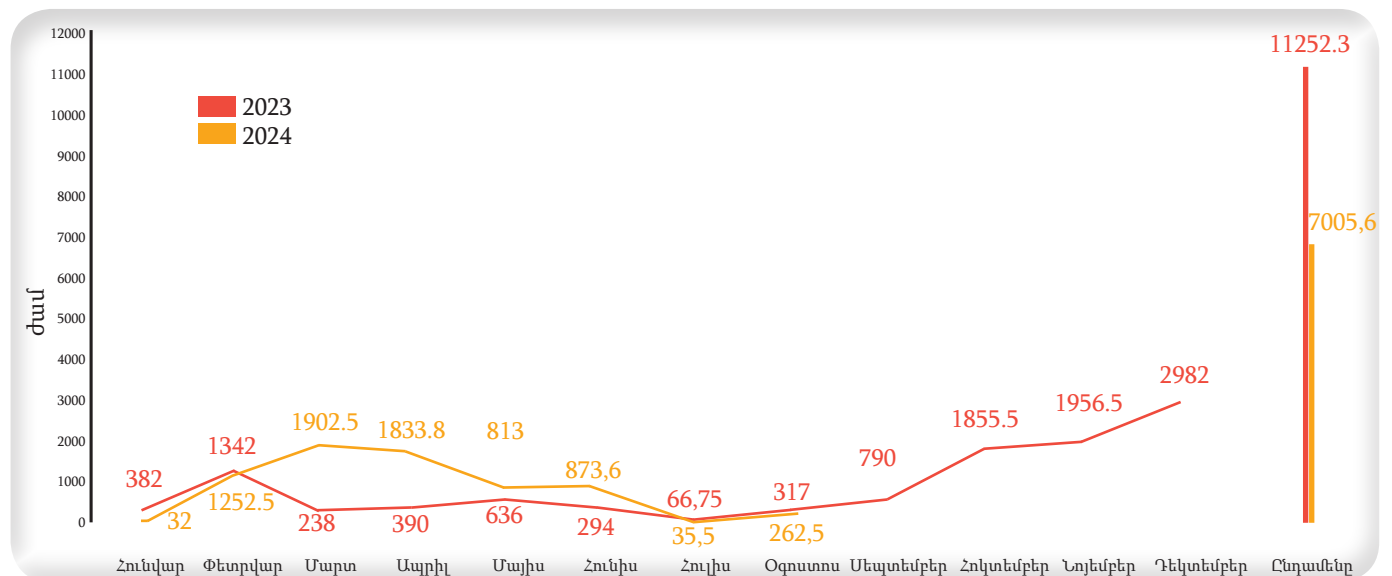


5.2. ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ/ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

■ Բաժնի անվտանգության պատասխանատուներն իրականացրեցին անվտանգության ստուգայքեր Ընկերության թվով 5 քլորակայանում: Ստուգայքերի նպատակն էր իրականացնել ռիսկերի գնահատում և կառուցվածքները շահագործող անձնակազմերի կողմից Ընկերությունում հաստատված անվտանգության հրահանգների պահանջների կատարման որակի մոնիթորինգ:

■ ՈԱԱ Բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են Հնկերության ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերում իրականացվող թվով 70 վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում տեղամասերի վթարավերականգնողական աշխատանքային խմբերի կողմից անվտանգության հրահանգների պահանջների կատարման որակը, տեղում տրվել են ցուցումներ անվտանգության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման մասնավորապես ԱՊՄ-ների կիրառման, մշակվող խրամուղիների պարագծով գծանշման, ծանր տեխնիկայի շահագործման ուղղությամբ, ինչպես նաև արձանագրված թերությունների վերաբերյալ կազմվեցին հաշվետվություններ և ներկայացվեցին Հնկերության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանուժների ղեկավարներին՝ արձանագրված թերությունների շտկման նպատակով:

2024 թ. իրականացված անվտանգության ստուգայցների քանակներն ըստ օբյեկտների

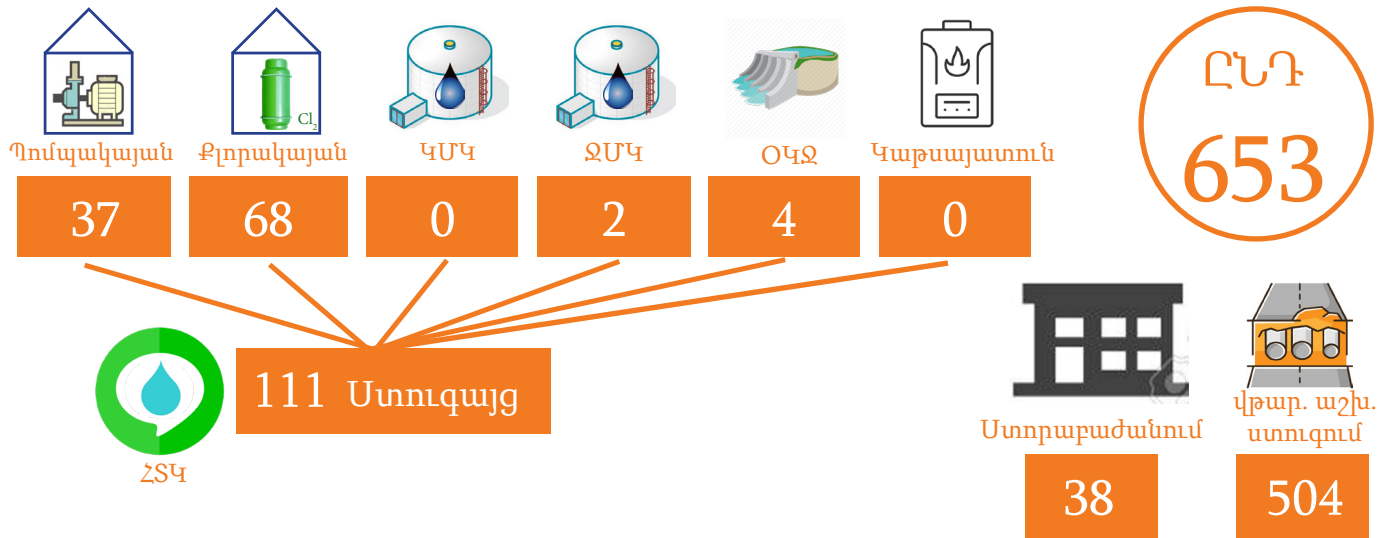

5.3 ՔԼՈՐԻ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԼՈՆԻ ԳԱԶԱԶԵՐԾՄԱՆ (ԴԵԳԱԶԱՑԻԱՅԻ) ՓԶԱՄԱՔՐՄԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

■ Հաշվետու ժամանակահատվածում, ՈԱԱ բաժինը, ՏՏ Ջրատ ծառայության հետ համատեղ, կազմակերպել է հեղուկ քլորի տարողությունների՝ թվով 10 կոնտեյների և թվով 26 բալոնի տեխնիկական վկայագրման աշխատանքներ, որն իր մեջ ներառում է ստորև ներկայացվող աշխատանքները.

- Քլորի տարողության գազագերծման (դեգազացիա) և փչամաքրման աշխատանքներ
- Քլորի տարողության արտաքին ակնադիտական զննում,
- Քլորի տարողության ներքին լապարասկոպիկ զննում,
- Քլորի տարողության մետաղի հաստության որոշում,
- Քլորի տարողության մետաղի կարծրության որոշում,
- Քլորի տարողության փորձարկային ճնշումով պնևմատիկ փորձարկում,
- Քլորի տարողության փականային արմատուրների, կցաշուրթերի, սիֆոնների ստուգում,
- Քլորի տարողության կիպության փորձարկում աշխատանքային ճնշման տակ,
- Քլորի տարողության ներկման աշխատանքներ:

5.4. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

■ ՈԱԱ բաժինը, հաշվետու ամսում առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 27 մարտի 2003 թվականի N 347-Ն և 15-ը հուլիսի 2004 թվականի N1089-Ն որոշումներով հաստատված կարգերի պահանջներով, կազմակերպեց Ընկերության համապատասխան մասնագիտություն ունեցող աշխատողների առողջական վիճակի դինամիկ հսկողության, մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման, վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների տարածման կանխարգելման և հիվանդությունների հայտնաբերման, տարեկան պարտադիր ստորև ներկայացվող բժշկական զննությունները և լաբորատոր հետազոտությունները:

■ ՀՀ կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշմամբ հաստատված, խմելու ջրի մաքրման, վարակազերծման և ջրամատակարարման ցանցի սպասարկման աշխատանքներում անմիջականորեն ներգրավված Ընկերության թվով 158 աշխատողի համար թերապևտիկ զննումներ և մանրէակրության, հելմինթոզների նկատմամբ հետազոտություններ:

■ ՀՀ կառավարության 15/07/2004 թ. N1089-Ն որոշմամբ հաստատված, արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի ժամանակաշրջանում վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող Ընկերության թվով 216 աշխատողի համար բժշկական զննումներ (թերապևտ, նյարդաբան, ակնաբույժ, օտոլարինգոլոգ, մաշկաբան) և ֆլյուրոնկարահնում:

5.5. ԱՊՄ-ՆԵՐԻ ԵՎ ԿՊՄ-ՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

■ Բաժինը, հաշվի առնելով ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի կողմից իրականացվող գործառնությունների բնույթը, դրանց կատարման ընթացքում ի հայտ եկող հնարավոր վտանգները և վերջինիս հետ կապված ռիսկերը, հիմք ընդունելով ՀՀ գործող ստանդարտների և Գրուպի ԲՌԿ Ստանդարտների պահանջները, հաշվետու ամսում, Ընկերության Ջրամատակարարման և Ջրահեռացման բաշխիչ ցանցերում իրականացվող վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում անվտանգ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու նպատակով Շահագործման տեղամասերին տրամադրեց ճանապարհային անվտանգության կոն, ժապավեն, տեղեկացնող, զգուշացնող, արգելող նշաններ, նշանների կիրառման համար հենարաններ, շարժական ցանկապատեր, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 1011 միավոր:

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ
ՀՀ, 0014, ք.երևան, Ն.Ադունցի 6/1
ՀՀ, 0025, ք.երևան, Աբովյան 66ա
E-mail: info@vjur.am
